


DADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA -MT



OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE JACIARA - MT

PROGRAMA -

- Programa:
- Objeto: **ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS - 2ª ETAPA**



JACIARA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

QUANTIDADE TOTAL: 138,98 KILÔMETROS

SICRO - 01/2021 - NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORA) 70,528%(MÊS)

BDI 21,35%

Estradas: JC-28/JC-14/JC-20/JC-23/JC-24/JC-25/JC-28 JC-02/JC-03/JC-06/JC-48/JC-15/JC-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 92.807,70
1.1	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	76.479,38	92.807,70	92.807,70
2.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 17.744,19
2.1	Composição 03	Mobilização e Desmobilização	UN	1,00	14.822,32	17.744,19	17.744,19
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 12.880,44
3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	37,44	285,70	348,70	12.980,44
4.0		LIMPEZA DE MATERIAL DE JAZIDA					R\$ 22.096,91
4.1	5502985 - SIORO	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	55.242,28	0,33	0,40	22.096,91
5.0		- TERREPLANEJAMENTO					R\$ 898.036,01
5.1	5501886 - SIORO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	80.262,80	8,39	10,16	817.075,30
5.2	5501887 - SIORO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 1.400 a 1.600 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	2.277,00	6,86	8,43	19.195,11
5.3	5501877 - SIORO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 400 a 600 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	3.023,00	5,93	7,20	21.765,60
6.0		- REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 766.642,68
6.1	4015612 - SIORO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	86.562,80	7,38	8,96	766.642,68
7.0		SALIDA D'ÁGUA					R\$ 11.269,83
7.1	4805757 - SIORO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	2.128,50	4,36	5,29	11.269,83

Total Geral (R\$) R\$ 1.781.567,93

Valor do km (R\$/km) ESTRADA R\$ 12.818,88

CAMILA DOSS
05267199150

CAMILA DOSS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 646807

Atestamos que a obra foi executada de acordo com o projeto e especificações técnicas, e que o valor total da obra é de R\$ 1.781.567,93 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).
Assinatura: _____
Data: 20/05/2021
Pelo Encarregado: _____

108



1998: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL VONAL 1ª ETAPA - MUNICÍPIO DE JACIARA - MT

SYMPTOMATOLOGY

178.000

[illegible]

© 2008 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part. WCN 02-200-203

© 2000 Blackwell Science Ltd

QUANTIDADE TOTAL

© 2017 BNC-400-150-08

[illegible][illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

© 2000 Blackwell Science Ltd

[illegible]

CRONOGRAFIA FISICO-FINANCIERA - NAU DESPONTIADO

[illegible]

CAMILA DOS
SANTOS
CAMILA DOS
SANTOS

CAMILA DOSS
05267199150

BDI NÃO DESONER

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

BDI NÃO DESONERADO

CONVÊNIO:

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE JACIARA - MT

PROGRAMA -

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CONFORME ACORDÃO 2622/2013

Descrição Despesas	%
Administração Central (AC)	4,01%
Seguro+Garantia	0,40%
Risco	0,56%
Despesa Financeira	1,11%
Lucro	7,30%
Impostos	
COPINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS	2,50%
CPRB*	
Tributos ()	6,15%
Total	21,35%

$$BDI = \left[\frac{(1+IC + S + R + GII + DFI + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Em que

AC é a taxa de risco de administração central

S é uma taxa representativa de seguros

R corresponde aos riscos e superávit

G é uma que representa o grau dos ganhos exigidos em edificação

DE é a taxa representativa dos despesas financeiras

L corresponde a remuneração bruta do construtor

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (IPI, Cofins, CPFB e ISS)

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA - 1º QUARTIL, MÉDIO E 2º QUARTIL	
Tipos de obra	
1º Quartil	22,12%
Médio	22,12%
2º Quartil	25,00%
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	19,60%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	20,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20,76%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	24,18%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	25,84%
OBRAS PORTUÁRIAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	27,48%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%

Figura 10 - Apresentação de referência do BDI por tipo de obra (Fonte: Acórdão 2622/2013 - Plenário)

TÍTULOS DE OBRA	
1º Quartil	22,12%
Médio	22,12%
2º Quartil	25,00%
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	19,60%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	20,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	24,18%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	25,84%
OBRAS PORTUÁRIAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	27,48%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%

TÍTULOS DE OBRA	
1º Quartil	22,12%
Médio	22,12%
2º Quartil	25,00%
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	19,60%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	20,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	24,18%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	25,84%
OBRAS PORTUÁRIAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	27,48%
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%

Figura 11 - Apresentação de referência do BDI por tipo de obra (Fonte: Acórdão 2622/2013 - Plenário)

22

Composição 01 => Administração local da obra

[illegible]

Composição Base => SINAPI - 74209/001

Composição 02

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

02/2021

Mato Grosso

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

m²

285,70

Código	Descrição	Unidade	Tipo	Valor sem Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração
C 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	18,63	1,0	18,63
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	14,87	2,0	29,74
C 94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	384,83	0,01	3,84
I 00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUGA	M	Material	3,26	1,0	3,26
I 00004491	ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO PONTLETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS,	M	Material	7,2	4,0	28,80
I 00004813	MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N	m²	Material	200,00	1,0	200,00
I 00005075	22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	Material	13,02	0,11	1,43
TOTAL DA COMPOSIÇÃO						285,70

15 15 

JACIARA
PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

QUANTIDADE TOTAL:

76,50

QUILÔMETROS

SICRO - 01/2021 / NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORA) 70,526%(MCS)

BOI

21,35%

LOTE 02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0.44	76.479,36	92.807,70	R\$ 40.836,39
2.0							
2.1	Composição 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0.44	14.022,02	17.744,19	R\$ 7.807,46
3.0							
3.1	Composição 02	SERVIÇOS PRELIMINARES	MO	17,28	285,70	346,70	R\$ 5.960,98
4.0							
4.1	5502905 - SICRO	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	29.566,74	0,33	0,40	R\$ 11.946,68
5.0							
5.1	5501806 - SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 5.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	46.510,00	8,39	10,18	R\$ 487.151,82
5.2	5501877 - SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 400 a 500 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	1.900,00	5,80	7,20	R\$ 13.680,00
6.0							
6.1	4016612 - SICRO	REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
6.1	4016612 - SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	48.410,00	7,38	8,96	R\$ 433.753,60
7.0							
7.1	4005757 - SICRO	SAÍDAS D'ÁGUA					
7.1	4005757 - SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VAIA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.186,50	4,36	5,29	R\$ 6.276,58

Total Geral (R\$)

R\$ 893.752,53

Valor do km (R\$/km) ESTRADA

R\$ 12.990,36

CAMILA DOSS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 046807

CAMILA DOSS
05267199150

89r



JACIARA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE JACIARA - MT

EXTENSÃO	2.100,00 METROS OU 2,1 QUILOMETROS		SICRO 01/2021 / NÃO DESONERADO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA 113,57%(HORA) 70,528%(MÊS)			BDI 21,35%

JC - 02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,04	76.479,36	92.807,70	R\$ 3.712,31
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
2.0	Composição 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	LN	0,04	14.622,32	17.144,18	R\$ 709,77
2.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
3.0	Composição 02	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2,88	285,70	346,70	R\$ 998,50
3.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					
4.0		LIMPEZA DE MATERIAL	M2	816,67	0,33	0,40	R\$ 326,67
4.1		LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL					
5.0	5501877 - SICRO	- TERRAPLENAGEM	M3	1.050,00	5,93	7,20	R\$ 7.560,00
5.1		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 400 a 600 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL					
6.0	4015612 - SICRO	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	1.050,00	7,38	8,96	R\$ 9.408,00
6.1		EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA					
7.0	4805757 - SICRO	SAÍDAS D'ÁGUA	M3	33,00	4,36	5,29	R\$ 174,57
7.1		ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA					

Total Geral (R\$) R\$ 22.889,82

CAMILA DOSS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - MT 046607

Valor do km (R\$/km) ESTRADA R\$ 10.899,91

18 8


JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 02

CÁLCULO DMT

A	B	C
35,00	1.000,00	1.100,00
DMT =>	526,20	metros

3.0 PLACA DA OBRA

COMP(M) LARG(M)

Considerada 01 placa no início do trecho

2,40	1,20	2,88
	1,00	2,88

4.0 LIMPEZA DE MATERIAL

4.1 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

VOL(M3) ESP(M) ÁREA(M2)

Área de Limpeza da Jazida

1.225,00	1,500	816,67
	TOTAL	816,67

Comprimento / Estrada Vicinal JC-02

2.100,00 2.100,00

Largura do revestimento primário

7,00

Espessura do revestimento primário

0,10

Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal:

1.470,00

5.0 - TERRAPLENAGEM:

5.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL

COMP(M) LARG(M) ESP(M) VOL(M3)

Comprimento / Estrada Vicinal JC-02

2.100,00	5,00	0,100	1.050,00
2.100,00		TOTAL	1.050,00

Jazida - 1 (1.0Km, até a entrada estrada vicinal) (material / seção ==> densidade = 1,6 ton/m3)

VOL(M3) DEN(T/M3) DMT(KM) MON(T/KM)

DMT = $35 + \frac{((1000^2 + 1100^2) / (2 * (1000 + 1100)))}{1,6} = 526,19m \Rightarrow 0,52 km$

1.050,00 1,760 0,52 960,96

6.0 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6.1 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA

COMP(M) LARG(M) ALTURA(M) ÁREA(M2)

2.100,00	5,00	0,10	1.050,00
		TOTAL	1.050,00

7.0 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

COMP(M) LARG(M) ALTU(M) VOL(M3)

COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)=2100/200=10,5 LOGO, 11 VEZES LATERAL DIREITA, 11 VEZES LATERAL ESQUERDA

3,00	1,00	0,500	1,50
22	3,00	TOTAL	33,00

 CAMILA DOSS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT - 046807



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE JACIARA - MT

EXTENSÃO:

12.000,00 METROS OU 12,0 QUILOMETROS

BDI:

21,35%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORR) 70,528%(MES)

JC - 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,09	79.479,36	92.807,70	R\$ 8.262,69
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
2.1	Composição 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,09	14.822,32	17.744,16	R\$ 1.998,96
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	265,70	346,79	R\$ 998,50
4.0	LIMPEZA DE MATERIAL						
4.1	5602985 - SICRO	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	4.000,00	0,33	0,40	R\$ 1.600,00
5.0	- TERRAPLENAGEM						
5.1	5501686 - SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMF DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	6.000,00	8,39	10,18	R\$ 61.080,00
6.0	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
6.1	4015612 - SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JÁDICA	M3	5.000,00	7,38	8,96	R\$ 63.760,00
7.0	SALDA D'ÁGUA						
7.1	4805757 - SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	180,00	4,36	5,29	R\$ 952,20
							Total Geral (R\$)
							R\$ 128.340,37
							Valor do IPI (R\$) ESTIMADA
							R\$ 10.695,03

CAROL A DOS
SANTANA-CRISTINA CIVIL
CREA - MT 04887

20

 JACIARA PREFEITURA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA				
OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT						
EXTENSÃO:	12.000,00 METROS OU 12,0 QUILOMETROS	S/CRO 01/2021 / NÃO DESONERADO BDI: 21,35%				
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORAI 70,528%(MÊS))						
JC - 03						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Item	Composição	Unid.	Quant.	Costo unit. sem BDI	Costo unit. com BDI	Total (R\$)
	Serviços					


JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 03

CÁLCULO DMT					
	A	B	C		
	118,00	4.824,00	7.176,00		
DMT =>		3.115,25	metros		
3.0	PLACA DA OBRA	COMP(M)	LARG(M)		
	Considerada 01 placa no início do trecho	2,40	1,20	2,88	
			1,00	2,88	
4.0	LIMPEZA DE MATERIAL				
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	VOL(M3)	ESP(M)	ÁREA(M2)	
	Área de Limpeza da Jazida	6.000,00	1,500	4.000,00	
			TOTAL	4.000,00	
	Comprimento / Estrada Vicinal JC-03	12.000,00	12.000,00		
	Largura do revestimento primário	7,00			
	Espessura do revestimento primário	0,10			
	Voluma de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal	6.000,00			
5.0	- TERRAPLENAGEM:				
5.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	COMP(M)	LARG(M)	ESP(M)	VOL(M3)
	Comprimento / Estrada Vicinal JC-03	12.000,00	5,00	0,100	6.000,00
		12.000,00		TOTAL	6.000,00
	Jazida - 1 (4,82 km, até a entrada estrada vicinal) (material / seixo -> densidade = 1,5 ton/m3)	VOL(M3)	DEN(T/M3)	DMT(KM)	MONIT (M)
	DMT= $118 + \frac{(4824^2 + 7176^2)}{[2 \cdot (4824 + 7176)]} = 3115,25m \Rightarrow 3,11 \text{ km}$	6.000,00	1,760	3,11	32.841,60
6.0	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
6.1	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	COMP(M)	LARG(M)	ALTURA(M)	ÁREA(M2)
		12.000,00	5,00	0,10	6.000,00
				TOTAL	6.000,00
7.0	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	COMP(M)	LARG(M)	ALTU(M)	VOL(M3)
	COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)=12000/200=60 LOGO, 60 VÉZES LATERAL DIREITA, 60 VÉZES LATERAL ESQUERDA	3,00	1,00	0,500	1,50
		120	3,00	TOTAL	180,00
CAMILA DOS ENGENHEIRA CIVIL CREA MT - 046807					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

JACIARA
PREFEITURA

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE JACIARA - MT

SICRO: 01/2021 / NÃO DESONERADO

15.893 METROS OU 15,9 QUILOMETROS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORAS) 70,528%(MÊS)

JC - 05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0	Administração Local da Obra		UN	0,09	76.479,36	92.807,70	R\$ 8.352,69
1.1	Composição 01		UN				
2.0	Mobilização e Desmobilização		UN	0,09	14.522,32	17.744,18	R\$ 1.596,98
2.1	Composição 03						
3.0	Serviços Preliminares						R\$ 998,50
3.1	Composição 02		M2	2,88	269,70	346,70	998,50
4.0	Limpeza de Material						R\$ 2.966,89
4.1	5602985 - SICRO	Limpeza Mecanizada da Camada Vegetal	M2	7.416,73	0,33	0,40	2.966,89
5.0	- TERRAPLENAGEM						R\$ 93.147,00
5.1	5501886 - SICRO	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria - DMT de 2.500 a 3.000 M - Caminho de Serviço em Lento Natural	M3	9.150,00	8,39	10,18	93.147,00
6.0	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO						R\$ 81.984,00
6.1	4019612 - SICRO	Execução de Revestimento Primário com Material de jazida	M2	9.150,00	7,36	8,96	81.984,00
7.0	SAÍDAS D'ÁGUA						R\$ 1.452,11
7.1	4805757 - SICRO	Escavação Mecânica de Vala em Material de 1ª Categoria	M3	274,50	4,36	5,29	1.452,11

Total Geral (R\$)

R\$ 190.497,97

Valor do km (R\$/km) ESTRADA

R\$ 1.062,47

CAMILA DOS
SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - MT 040007

23



JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 05

CÁLCULO DMT						
	A	B	C			
	190,00	3.202,00	15 098,00			
DMT =>		6.608,27	metros			
3.0 PLACA DA OBRA						
		COMP(M)	LARG(M)			
Considerada 01 placa no início do trecho		2,40	1,20	2,88		
			1,00	2,88		
4.0 LIMPEZA DE MATERIAL						
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	VOL(M3)	ESP(M)	ÁREA(M2)		
	Área de Limpeza da Jazida	11.125,10	1,500	7.416,73		
			TOTAL	7.416,73		
	Comprimento / Estrada Vicinal JC-05	18.300,00	18.300,00			
	Largura do revestimento primário	7,00				
	Espessura do revestimento primário	0,10				
	Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal	12.810,00				
5.0 - TERRAPLENAGEM						
5.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	COMP(M)	LARG(M)	ESP(M)	VOL(M3)	
	Comprimento / Estrada Vicinal JC-05	18.300,00	5,00	0,100	9.150,00	
		18.300,00		TOTAL	9.150,00	
	Jazida - 1 (3,20km, até a entrada estrada vicinal) (material : saibro ==> densidade = 1,5 ton/m3)	VOL(M3)	DEN(T/M3)	DMT(KM)	MON(T KM)	
	DMT = $190 + \frac{(3202^2 + 15098^2)}{[2 \cdot (3202 + 15098)]} = 6.608,27m \Rightarrow 6,6 km$	9.150,00	1.760	6,50	104.676,00	
6.0 - REVESTIMENTO PRIMARIO						
6.1	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA	COMP(M)	LARG(M)	ALTURA(M)	ÁREA(M2)	
		18.300,00	5,00	0,10	9.150,00	
				TOTAL	9.150,00	
7.0 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA						
		COMP(M)	LARG(M)	ALTU(M)	VOL(M3)	
	COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)=18300/200=91,55 LOGO, 91,5 VEZES LATERAL DIREITA, 91,5 VEZES LATERAL ESQUERDA	3,00	1,00	0,500	1,50	
		183	3,00		TOTAL	274,50
CAMILA DOSS ENGENHEIRA CIVIL CREA MT - 046807						



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

EXTENSÃO:	16.000,00 METROS OU 16,0 QUILOMETROS	SICRO 01/2021 - NÃO DESONERADO	21,35%
		BDI:	

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA 113,57%(HORA) 70,528%(MÊS)

JC - 45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 8.352,69
1.1	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,09	76.479,36	92.907,70	8.352,69
2.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 1.596,98
2.1	Composição 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,09	14.622,32	17.744,18	1.596,98
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 998,50
3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	285,70	346,70	998,50
4.0		LIMPEZA DE MATERIAL					R\$ 2.986,67
4.1	5502985 - SICRO	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	7.486,87	0,33	0,40	2.986,67
5.0		- TERRAPLENAGEM:					R\$ 114.015,00
5.1	5501888 - SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	11.200,00	8,39	10,18	114.015,00
6.0		- REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 100.352,00
6.1	4015612 - SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	11.200,00	7,38	8,95	100.352,00
7.0		SAÍDAS D'ÁGUA					R\$ 1.269,60
7.1	4806757 - SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	240,00	4,36	5,29	1.269,60

Total Geral (R\$) R\$ 229.572,44

CAMILA DOS
SANTOS ENGENHEIRA CIVIL
CREA - MT 046607

Valor do km (R\$/km) ESTRADA

R\$ 14.348,28

25



JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 45

CÁLCULO DMT					
	A	B	C		
	485,13	2 198,00	13.802,00		
	DMT =>	6.103,96	metros		
3.0	PLACA DA OBRA	COMP(M)	LARG(M)		
	Considerada 01 placa no início do trecho	2,40	1,20	2,88	
			1,00	2,88	
4.0	LIMPEZA DE MATERIAL				
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	VOL(M3)	ESP(M)	ÁREA(M2)	
	Área de Limpeza da Jazida	11 200,00	1,500	7 466,67	
			TOTAL	7 466,67	
	Comprimento / Estrada Vicinal JC-45	16 000,00	16 000,00		
	Largura do revestimento primário	7,00			
	Espessura do revestimento primário	0,10			
	Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal:	11.200,00			
5.0	- TERRAPLENAGEM:				
5.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	COMP(M)	LARG(M)	ESP(M)	VOL(M3)
	Comprimento / Estrada Vicinal JC-45	16 000,00	7,00	0,100	11 200,00
		16 000,00		TOTAL	11 200,00
	Jazida - 1 (2,1Km. até a entrada estrada vicinal) (material / seio *** densidade = 1,6 ton/m3)	VOL(M3)	DEN(T/M3)	DMT(KM)	MON(T KM)
	DMT= $485,13 + \frac{((2198^2 + 13802^2)^{1/2} - 2 \cdot (2198 \cdot 13802))}{2} = 6.103,96m \Rightarrow 6,10 \text{ km}$	11 200,00	1,760	6,10	120 243,20
6.0	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
6.1	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	COMP(M)	LARG(M)	ALTURA(M)	ÁREA(M3)
		16 000,00	7,00	0,10	11 200,00
				TOTAL	11 200,00
7.0	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	COMP(M)	LARG(M)	ALTU(M)	VOL(M3)
	COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)=16000/200=80 LOGO, 80 VEZES LATERAL DIREITA, 80 VEZES LATERAL ESQUERDA	3,00	1,00	0,500	1,50
		160	3,00	TOTAL	240,00
CAMILA DOSS ENGENHEIRA CIVIL CREA MT - 046807					



JACIARA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

EXTENSÃO	28.800,00 METROS OU 28,8 QUILOMETROS	SICRO 01/2021 / NÃO DESONERADO	21,35%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA	113,57%(HORA) 70,528%(MÊS)	BDI	

JC - 15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo Unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	LN	0,08	76.479,36	92.807,70	R\$ 8.352,69
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 8.352,69
2.0	Composição 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	LN	0,09	14.622,32	17.744,18	R\$ 1.596,98
2.1		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 1.596,98
3.0	Composição 02	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2,88	285,70	346,70	R\$ 990,60
3.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					R\$ 990,60
4.0	5502385 - SICRO	LIMPEZA DE MATERIAL	M2	9.800,00	0,33	0,40	R\$ 3.840,00
4.1		LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL					R\$ 3.840,00
5.0	5501888 - SICRO	- TERRAPLENAGEM	M3	20.160,00	8,39	10,18	R\$ 205.228,80
5.1		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL					R\$ 205.228,80
6.0	4019512 - SICRO	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	20.160,00	7,38	8,96	R\$ 180.633,60
6.1		EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA					R\$ 180.633,60
7.0	4805757 - SICRO	SAÍDAS D'ÁGUA	M3	432,00	4,36	5,29	R\$ 2.286,28
7.1		ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA					R\$ 2.286,28

Total Geral (R\$) R\$ 402.935,86

CARLA DOSS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - MT 048907

Valor do km (R\$/km) ESTRADA R\$ 14.187,88

Valor do km (R\$/km) ESTRADA R\$ 14.187,88

27


JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 15

CÁLCULO DMT				
	A	B	C	
	489,00	12.873,00	15.927,00	
DMT =>		7.173,00	metros	
	COMP(M)	LARG(M)		
3.0 PLACA DA OBRA		2,40	1,20	2,88
Considerada 01 placa no início do trecho			1,00	2,88
	VOL(M3)	ESP(M)	AREA(M2)	
4.0 LIMPEZA DE MATERIAL				
4.1 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	14.400,00	1,500	9.800,00	
Área de Limpeza da Jazida			TOTAL	9.800,00
	28.800,00	28.800,00		
Comprimento / Estrada Vicinal JC-15	5,00			
Largura do revestimento primário	0,10			
Espessura do revestimento primário	14.400,00			
Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal				
5.0 - TERRAPLENAGEM:				
	COMP(M)	LARG(M)	ESP(M)	VOL(M3)
5.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL, DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	28.800,00	7,00	0,100	20.160,00
Comprimento / Estrada Vicinal JC-15	28.800,00		TOTAL	20.160,00
Jazida - 1 (12,9Km, até a entrada estrada vicinal) (material: solo) *** densidade = 1,6 ton/m3)	VOL(M3)	DEN(T/M3)	DMT (KM)	MON(T KM)
DMT = $489 + \frac{((1000^2 + 1100^2) \cdot 2)}{(2 \cdot (1000 + 1100))} = 526,19m \Rightarrow 0,52 \text{ km}$	20.160,00	1,760	0,52	18.450,43
6.0 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
	COMP(M)	LARG(M)	ALTURA(M)	AREA(M2)
6.1 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	28.800,00	7,00	0,10	20.160,00
			TOTAL	20.160,00
	COMP(M)	LARG(M)	ALT(M)	VOL(M3)
7.0 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA				
COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)=28800/200=144 LOGO, 144 VEZES LATERAL DIREITA, 144 VEZES LATERAL ESQUERDA	288	3,00	0,500	432,00
			TOTAL	432,00
CAMILA DOSS ENGENHEIRA CIVIL CREA MT - 048807				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

EXTENSÃO

1.700,00 METROS OU 1,70 QUILOMETROS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORA) 70,528%(M2S)

JC - 06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	Composição 01		UM	0,04	76.479,36	92.807,70	3.712,31
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
2.1	Composição 02		UM	0,04	14.622,32	17.744,18	709,77
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	Composição 02		M2	2,88	285,70	346,70	998,60
4.0	LIMPEZA DE MATERIAL						
4.1	5602985 - SÍMBOLO	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	1668,67	0,33	0,40	226,67
5.0	- TERRAPLENAGEM						
5.1	5601677 - SÍMBOLO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 400 a 600 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LITO NATURAL	M3	860,00	5,93	7,70	6.120,00
6.0	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
6.1	4015612 - SÍMBOLO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M2	860,00	7,38	8,96	7.616,00
7.0	salvas d'água						
7.1	4806757 - SÍMBOLO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M5	27,00	4,36	5,29	142,83
							R\$ 19.526,98
							R\$ 12.053,14

CAMILA DOS
SANTOS
PROJENHEIRA CIVIL
CREA - MT 048807

62

308


JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 06

CÁLCULO DMT					
	A	B	C		
	35,36	1.442,00	258,00		
	DMT =>	661,86	metros		
3.0	PLACA DA OBRA	COMP(M)	LARG(M)		
	Considerada 01 placa no início do trecho	2,40	1,20	2,88	
			1,00	2,88	
4.0	LIMPEZA DE MATERIAL				
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	VOL(M3)	ESP(M)	ÁREA(M2)	
	Área de Limpeza da Jazida	850,00	1,500	566,67	
			TOTAL	566,67	
	6Comprimento / Estrada Vicinal JC-06	1.700,00	1.700,00		
	Largura do revestimento primário	5,00			
	Espessura do revestimento primário	0,10			
	Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal:	850,00			
5.0	- TERRAPLENAGEM:				
5.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 400 a 600 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	COMP(M)	LARG(M)	ESP(M)	VOL(M3)
	6Comprimento / Estrada Vicinal JC-06	1.700,00	5,00	0,100	850,00
		1.700,00		TOTAL	850,00
	Jazida = 1 (0,035Km, até a entrada estrada vicinal) (material / seção ===== densidade = 1,8 ton/m ³)	VOL(M3)	DEN(T/M3)	DMT(KM)	MON(T KM)
	DMT= 35,36 + $\frac{((177^2 + 1442^2) / (2*(177+1442)))}{1}$ = 661,86 m => 0,66 km	850,00	1,760	0,65	972,40
6.0	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
6.1	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	COMP(M)	LARG(M)	ALTURA(M)	ÁREA(M3)
		1.700,00	5,00	0,10	850,00
				TOTAL	850,00
7.0	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	COMP(M)	LARG(M)	ALTU(M)	VOL(M3)
	COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS=1700/200=8,5 LOCO, 9 VEZES LATERAL DIREITA,9 VEZES LATERAL ESQUERDA	3,00	1,00	0,500	1,50
		18	3,00	TOTAL	27,00
CAMILA DOSS ENGENHEIRA CIVIL CREA MT - 046807					

31 B



Estradas Municipais Não Pavimentadas - Município de Jaciara		EXTENSÃO TOTAL (KM)
OBRA:	ESTRADAS	
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL VITINAL 2ª ETAPA	FOMENTAR A AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	JC 45 : JC 02; JC 25; JC 29; JC 24; JC 23; JC 20; JC 28; JC 05; JC 03; JC 14; JC 15; JC 06
		138,98

JC 23

33



VISUALIZAÇÃO POR SATELITE

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	
Nome da Estrada: MADEIRA Número da Estrada: 23 Data de Criação: 10/01/2011	
Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada	
Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada	
Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada	
Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada Nome do Projeto: Projeto de Pavimentação de Estrada	

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
JC - 23	Lat 15°53'41.31"S Long 54°57'32.19"O	Proximidade a MT - 457 - Vinte e Sete	Lat 15°53'54.04"S Long 54°58'39.28"O	2,24

Estradas Municipais Não Pavimentadas



VISUALIZAÇÃO POR SATÉLITE



DETALHAMENTO DA VIA

[illegible]

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
145 - 90	Lat 15°55'N Long 55°1'38" W	Proximidade a MT - 457 - Água Grande	Lat 15°55'11.36"S Long 54°57'50.76"O	9,33



VISUALIZAÇÃO POR SATELITE

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
IC - 20	Lat 15°55'6.11"N Long 53°1'38.74"W	Proximidade a MT - 457 - Água Grande	Lat 15°55'11.36"N Long 54°57'29.36"E	9,33

36



Seção 1.00
1.00 km



VISUALIZAÇÃO POR SATELITE

36

Córrego d'Água

Córrego Arrozal

JC-14 17 800,00

Culminância Br/norte

CAJATIUS
CENÁRIO

DETALHAMENTO DA VIA

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	
Nome: Maria Estelita Nunes Função: Assessoria Jurídica Endereço: Av. Brasil, 1000 - J. Jaciara Cidade: Jaciara - MT CEP: 78.000-000	Nome: Camila Costa Função: Assessoria Jurídica Endereço: Av. Brasil, 1000 - J. Jaciara Cidade: Jaciara - MT CEP: 78.000-000
Nome: Camila Costa Função: Assessoria Jurídica Endereço: Av. Brasil, 1000 - J. Jaciara Cidade: Jaciara - MT CEP: 78.000-000	
Nome: Camila Costa Função: Assessoria Jurídica Endereço: Av. Brasil, 1000 - J. Jaciara Cidade: Jaciara - MT CEP: 78.000-000	

Estradas Municipais Não Pavimentadas

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
JC-14	Lat 15°54'22.07"S Long 55°52'1.02"O	Lat 15°55'55.24"S Long 55°13'39.15"O	17.80

LOCALIZAÇÃO RODOVIA

Proximidade a MT-140 - Usina Pantanal



JC 14
 EXTENSÃO 10,145M
 Coordenada Geográfica
 Início - Lat 15°54'22,07"S Long 55°52'1,02"O
 Fim - Lat 15°55'15,24"S Long 55°13'39,15"O

Legenda
 Extensão 10,145M
 JC 14

VISUALIZAÇÃO POR SATELITE

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
JC - 14	Lat 15°54'22,07"S Long 55°52'1,02"O	Proximidade a MT - 140 - União Paulista	Lat 15°55'15,24"S Long 55°13'39,15"O	17,80

Estradas Municipais Não Pavimentadas

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ

Nome Estrada Municipal: Aduela - Estrada Vicinal 7ª Etapa

Assessoria: Engenharia Municipal de Jacaré

Projeto: 01/03/2008/115

Assessoria: Engenharia Municipal de Jacaré

Projeto: 01/03/2008/115

Assessoria: Engenharia Municipal de Jacaré

Projeto: 01/03/2008/115

Assessoria: Engenharia Municipal de Jacaré

Projeto: 01/03/2008/115

Assessoria: Engenharia Municipal de Jacaré

Projeto: 01/03/2008/115

Assessoria: Engenharia Municipal de Jacaré

JC 14

34 B

Córrego da Jurita


JC 29

Lat 15°47'26.55"S
Long 55°4'45.89"O

9.200,00

JC 29

Lat 15°48'49.47"S
Long 55°3'50.50"O

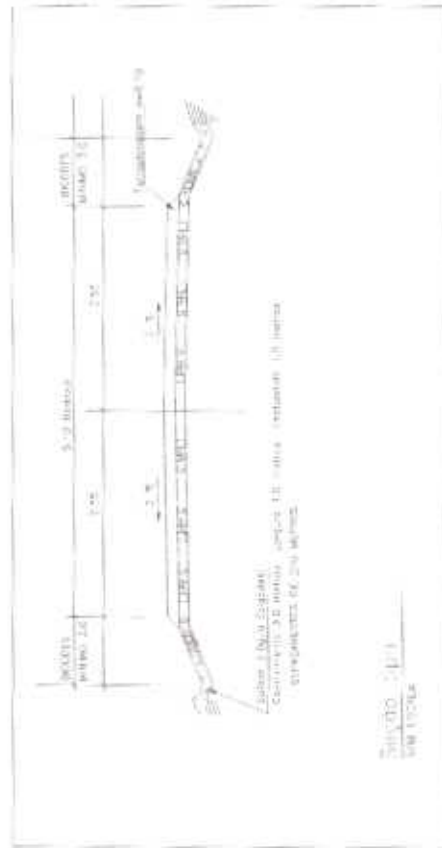

VISUALIZAÇÃO POR SATELITE

[illegible]

DETA LHAMENTO DÁ VA

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
AC - 29	Lat 15°48'49.4" S Long 55°45'50.50" O	Proximidade a MT - 457 - Aeroporto Pádua Piloto	Lat 15°47'26.55" S Long 55°44'45.89" O	9,2

Coordinates Geographic:
India - Lat 19°43'42.47"S Long 59°56'50.0"E
Fiji - Lat 19°47'26.55"S Long 59°44'45.85"E

Legenda

CONTENTS iii

6239



VISUALIZATION OF SPATIAL

Estradas Municipais Não Pavimentadas

ESTRADA	COORDENADA GEOGRAFICA - INICIO	LOCALIZACAO RODOVIA	COORDENADA GEOGRAFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
1C - 29	Lat 13°48'49.47"S Long. 55°3'50.50"O Lat 15°47'26.55"S Long. 55°04'45.89"O	Proximidade à MT - 457 - Assentamento Plano Piloto	Lat 15°47'26.55"S Long. 55°04'45.89"O	9,2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUARA

Dr. M. Estrada-Munoz - Asociado Senior Virología (1998)

Source: *U.S. Census Bureau, 1997*

Source: *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 1997, 36(12), 1711-1720.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CREDIT ADVISORY: **ANDREA** GET THE LOWEST RATES
 EXPENSES: **7.49%** 2015 APR 10/15
CARLA A. CROSS EXPERIENCED HOME

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

13. *How many of the following are correct?*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

10

CONTACTING VALUE

[illegible]

JC 28

062 151 553 Buoi
S.06 21.07.151 117

DE L'ALHAMBRA DA VIA



240



	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUARA	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE	SECRETARIA DE SAÚDE

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
JC - 28	Lat 15°48'52.92"S, Long 53°31'29"O	Proximidade a MT - 457	Lat 15°46'04.877"S, Long 55°1'55.55"O	7,96

EXTENSÃO 1,35 KM
Coordenada Geográfica
Início Lat 15°40'52.9" S Long 55°03'31.29" O
Fim Lat 16°04'4.87" S Long 55°01'45.56" O

EXTENDED TO 30.10M



Estradas Municipais Não Pavimentadas.

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
IC - 28	Lat 15°48'52,90"S Long 55°31'29"O	Proximidade a MT - 437	Lat 15°46'48,77"S Long 55°15'55,45"O	7,96

Name:
Matr. No.:

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

THE

1

Copyright © 2009 by John Wiley & Sons, Inc.

100

1. [Link](#)

Implications / Auswirkungen für die Praxis

Copyright © 2005, John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

100

100

Figure 6

1. [The Best of the Best](#)

11.6

Author's address: Department of Computer Science, University of Illinois at Chicago, 606 S. Morgan St., Chicago, IL 60607-7159, USA.
E-mail: shankar@cs.uic.edu

100

Abstract

11

1000

100

[illegible]

not a true peak

Figure 6

1. [Introduction](#)

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1

4.554,00 metros

Lat 15°47'17.42"S
Long 54°58'44.74"O

JC 25

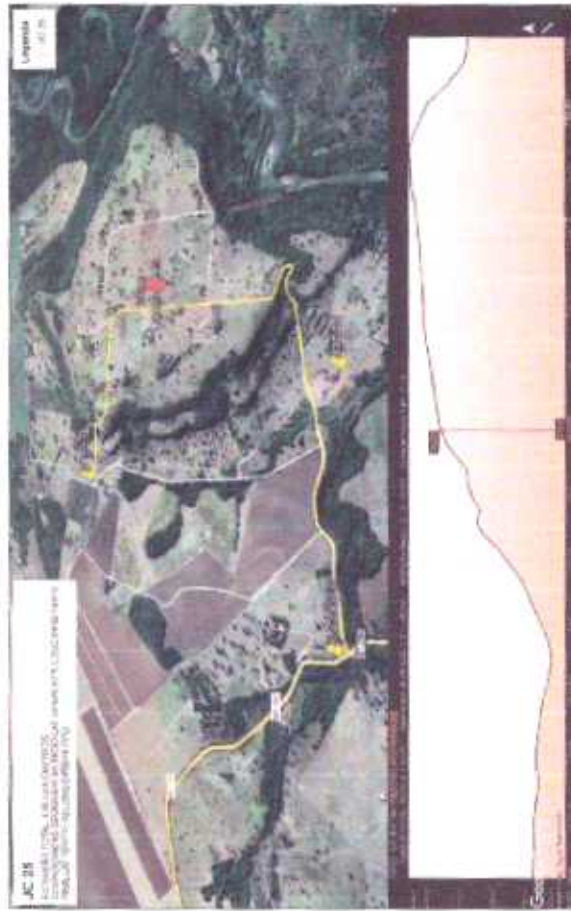

VISUALIZAÇÃO POR SATÉLITE

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUARA	União Estadual Municipal - Administração Estadual e Municipal	União Estadual Municipal - Administração Estadual e Municipal	União Estadual Municipal - Administração Estadual e Municipal	União Estadual Municipal - Administração Estadual e Municipal	União Estadual Municipal - Administração Estadual e Municipal
---	---	---	---	---	---

42 B

DETALHAMENTO DA VIA

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
AC - 25	Lat 15°48'01,57" S Long 54°50'36,54" O	Proximidade a MT - 457 - Asentamiento Lombardi	Lat 15°47'17,42" S Long 54°58'44,74" O	4,55

EXTENSÃO TOTAL 4,88 QUILÔMETROS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS INICIO LIT 18490 6725 LONGO 045652 8870
FIM LIT 18497 17 40 LONGO 045654 2870

Estradas Municipais Não Pavimentadas

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
AC - 25	Lat 15°48'57"S Long 54°59'3,65"O	Proximidade a MT - 457 - Assentamento Lambour	Lat 15°47'17,42"S Long 54°58'43,74"O	4,55



Nome	Major Celso Augusto de Souza
Matrícula	10.101.10000-10
Assinatura	Assinatura do Prestador de Serviço

Fraipaese Amministrato da Reine

TURK E LAI (LAKESIDE)
ANDREA
MAGNETI
87-396-21-75

Sandy Rose


Pagamento Conto (ITA) N° 140027
CAMILA
DOSSÉ
87-396-21-75

Indirizzo: BELLAROSA, 73042

Indirizzo: MONTECORVENE, 73042

[illegible]

14					
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88		



 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO	1000 000 0000 Móda Espetáculo Municipal - Administração Espetáculo Municipal de Jucarezo	1000 000 0000 Móda Espetáculo Municipal - Administração Espetáculo Municipal de Jucarezo	1000 000 0000 Móda Espetáculo Municipal - Administração Espetáculo Municipal de Jucarezo	1000 000 0000 Móda Espetáculo Municipal - Administração Espetáculo Municipal de Jucarezo	1000 000 0000 Móda Espetáculo Municipal - Administração Espetáculo Municipal de Jucarezo	1000 000 0000 Móda Espetáculo Municipal - Administração Espetáculo Municipal de Jucarezo	1000 000 0000 Móda Espetáculo Municipal - Administração Espetáculo Municipal de Jucarezo	1000 000 0000 Móda Espetáculo Municipal - Administração Espetáculo Municipal de Jucarezo	1000 000 0000 Móda Espetáculo Municipal - Administração Espetáculo Municipal de Jucarezo
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
JC - 24	Lat 15°51'17,94"S Long 54°58'6,39"O	Proximidade a MT - 457 - Aterramento São Francisco	Lat 15°49'25,22"S Long 54°51'5,01"O	11,40

JC 24

EXTENSÃO 11,40 KM
Coordenadas Geográficas
Início - Lat 15°51'17.94"S Long 54°58'6.39"W
Fim - Lat 15°49'25.22"S Long 54°21'5.01"W

Legenda

EXTENSÃO 11,40 KM
JC 24



VISUALIZAÇÃO POR SATELITE

Estradas Municipais Não Pavimentadas

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
JC 24	Lat 15°51'17.94"S Long 54°58'6.39"W	Proximidade a MT - 457 - Aterramento São Francisco	Lat 15°49'25.22"S Long 54°21'5.01"W	11,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PROJETOS MUNICIPAIS DE ABRIL

Município: Município: Acomodação (Caminho Verde) 2ª Fase

Projeto: Projeto de Acomodação

Local: 20 247 100000 10

Coordenadas: 20 247 100000 10

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação

Projeto: Projeto de Acomodação



JACIARA
PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024

Caracterização das Estradas Vicinais Inclusas na Proposta de
“Adequação de Estradas Vicinais - 2ª Etapa”

Contrato Repasse MAPA 908656/2020

Operação 1074472-49 – Prefeitura Municipal de Jaciara

Contém as Descrições das vias com Coordenadas Geográficas de Início/final da via; Ponto de Jazida; Extensão das Vias; Relatório Fotográfico.

46 18

JC 02:

Detalhes: Início pela MT-457;

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°59'6.20"S Longitude 54°57'22.71"O
Final: Coordenada Geográfica: Latitude 15°59'54.42"S Longitude 54°57'28.87"O

Extensão total: 2,10 Quilômetros ou 2.100,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 1.000,00 Metros (início a Jazida) – 35 metros da Estrada Municipal JC02 ao ponto de extração.
Coordenada Geográfica: Latitude: 15°59'38.73"S Longitude: 54°57'17.82"O


Relatório Fotográfico:






JACIARA

PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024

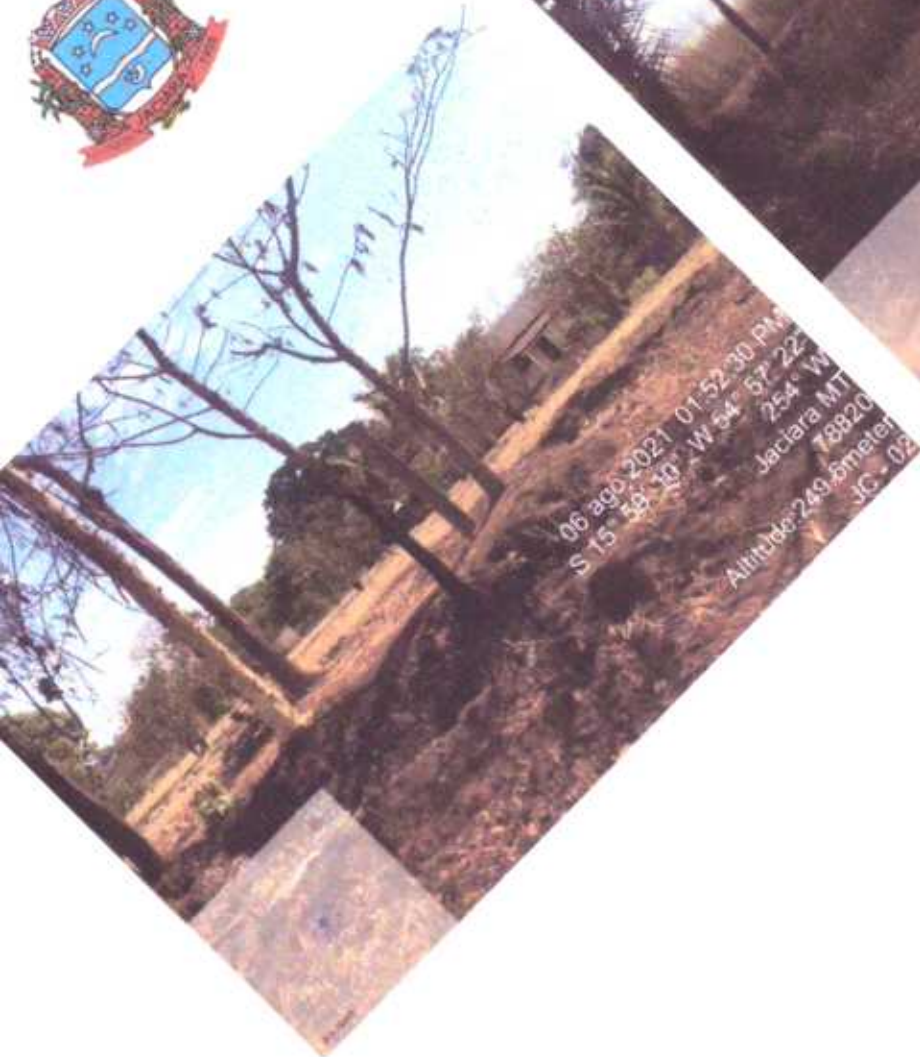

06 ago 2021 01:52:30 PM
S 15° 59' 54" W 54° 57' 22"
Altitude: 249.6meter
Jaciara MT 78820
JC - 02

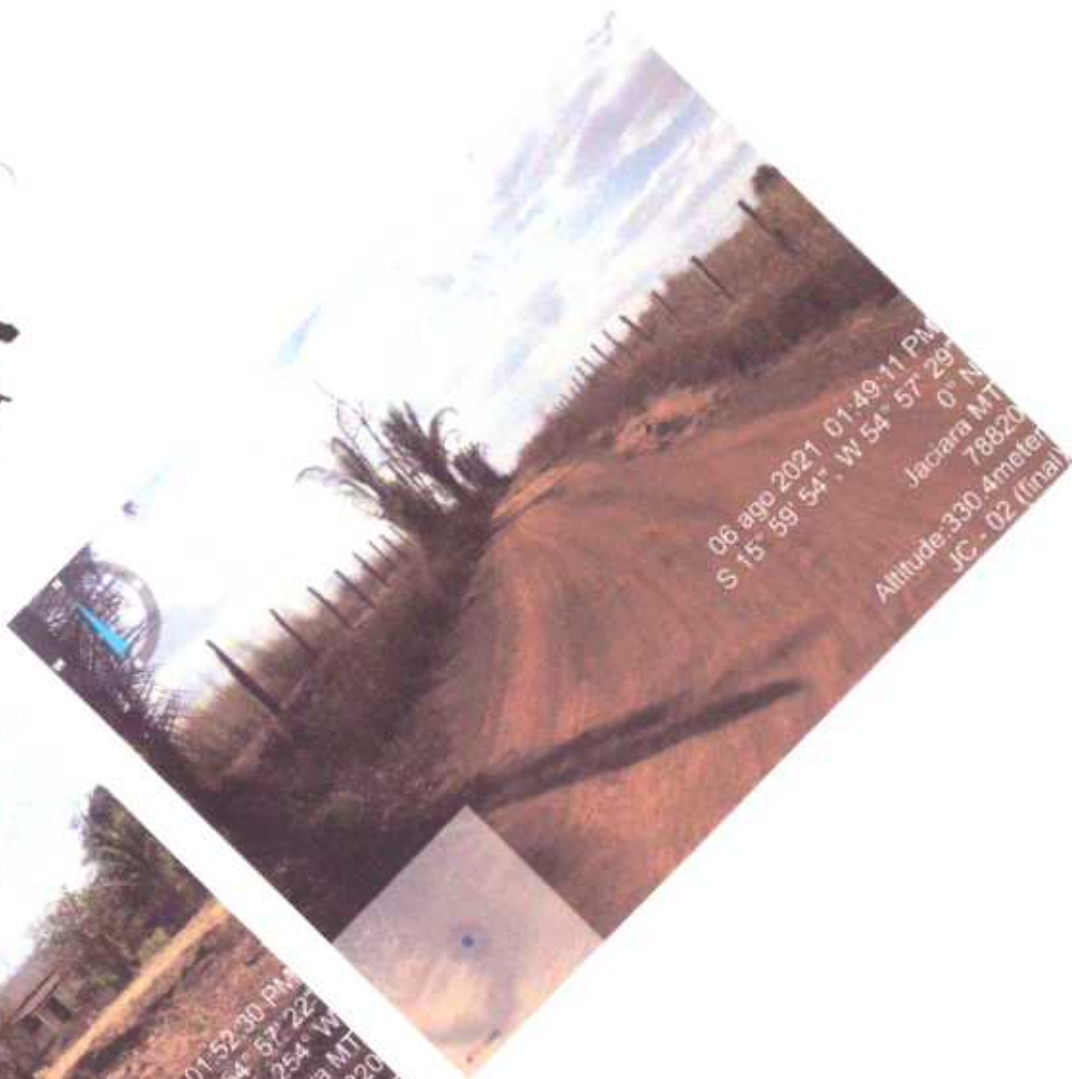

06 ago 2021 01:49:11 PM
S 15° 59' 54" W 54° 57' 29"
Altitude: 330.4meter
Jaciara MT 78820
JC - 02 (final)

JC 03:



Detalhes: Início pela MT 457

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°59'20,34"S Longitude 54°58'12,69"O
Final: Coordenada Geográfica: Latitude 16°4'17,32"S Longitude 55°0'21,75"O

Extensão total: 12,0 Quilômetros ou 12.000,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 4824,00 Metros (início a Jazida) – 118 metros da Estrada Municipal JC03 ao ponto de extração.
Coordenada Geográfica: Latitude: 16°3'15,20"S Longitude: 54°58'21,35"O

Relatório Fotográfico:

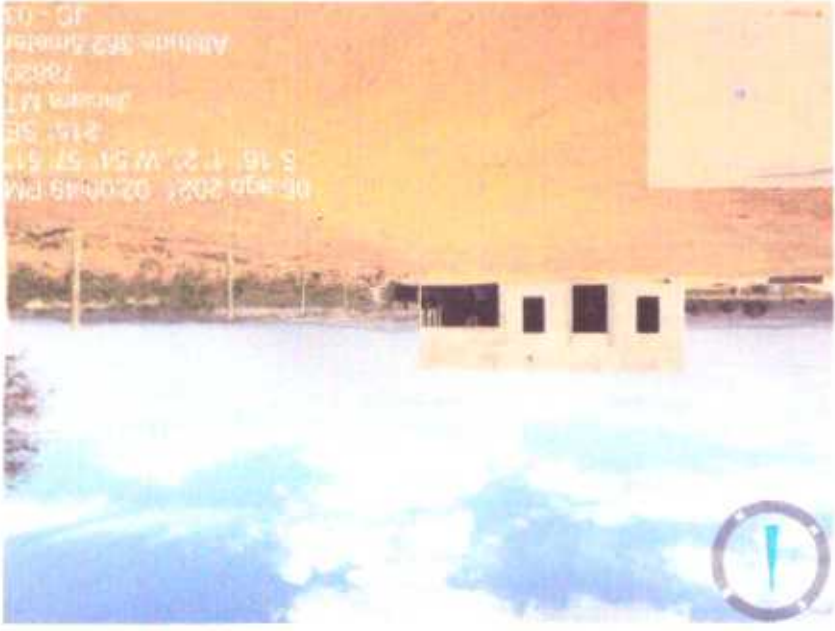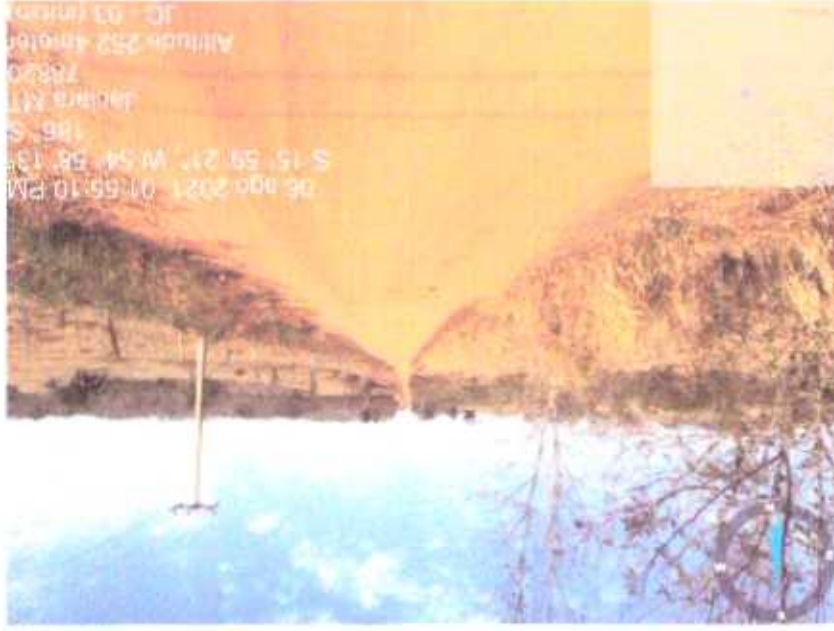




JACIARA


PREFEITURA

GESTÃO 2021/2024

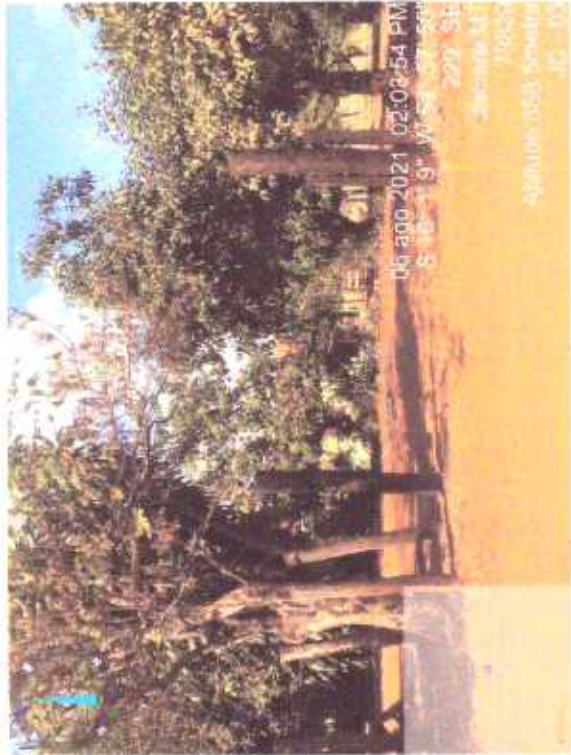

50

518

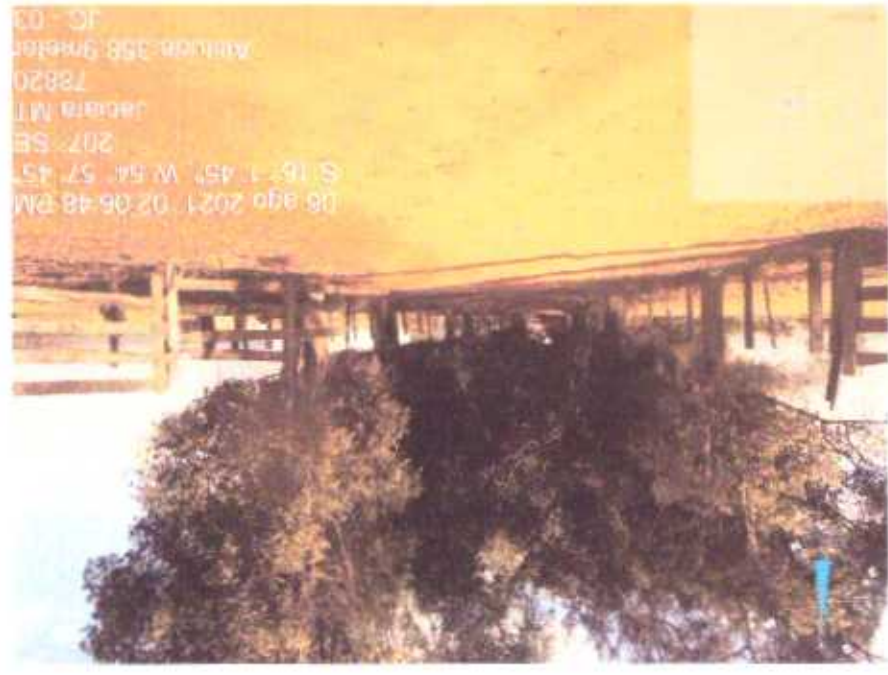

JACIARA
PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024



JC 05:


Detalhes: Início pela MT-457

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°58'59,49"S Longitude 54°59'1,91"O
Final: Coordenada Geográfica: Latitude 16°3'45,65"S Longitude 55°5'15,34"O

Extensão total: 15,9 Quilômetros ou 15.893,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 3.202,00 Metros (início a Jazida) – 190 metros da Estrada Municipal JC05 ao ponto de extração.
Coordenada Geográfica: Latitude: 15°59'37,53"S Longitude: 55°0'34,87"O

Relatório Fotográfico:

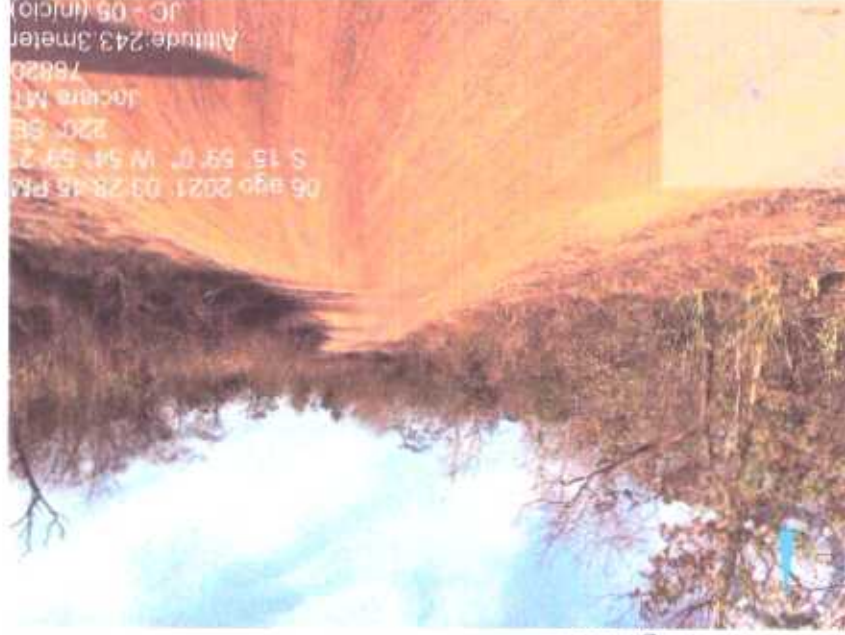


JC 06:

Detalhes: Início pela MT-457;

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°58'55.46"S Longitude 55°0'54.59"O
Final: Coordenada Geográfica: Latitude 15°59'47.69"S Longitude 55°0'54.81"O

Extensão total: 1.70 Quilômetros ou 1.700,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 1.4420,00 Metros (início a Jazida) – 35 metros da Estrada Municipal JC06 ao ponto de extração.
Coordenada Geográfica: Latitude: 15°59'1.40"S Longitude: 55°0'56.33"O

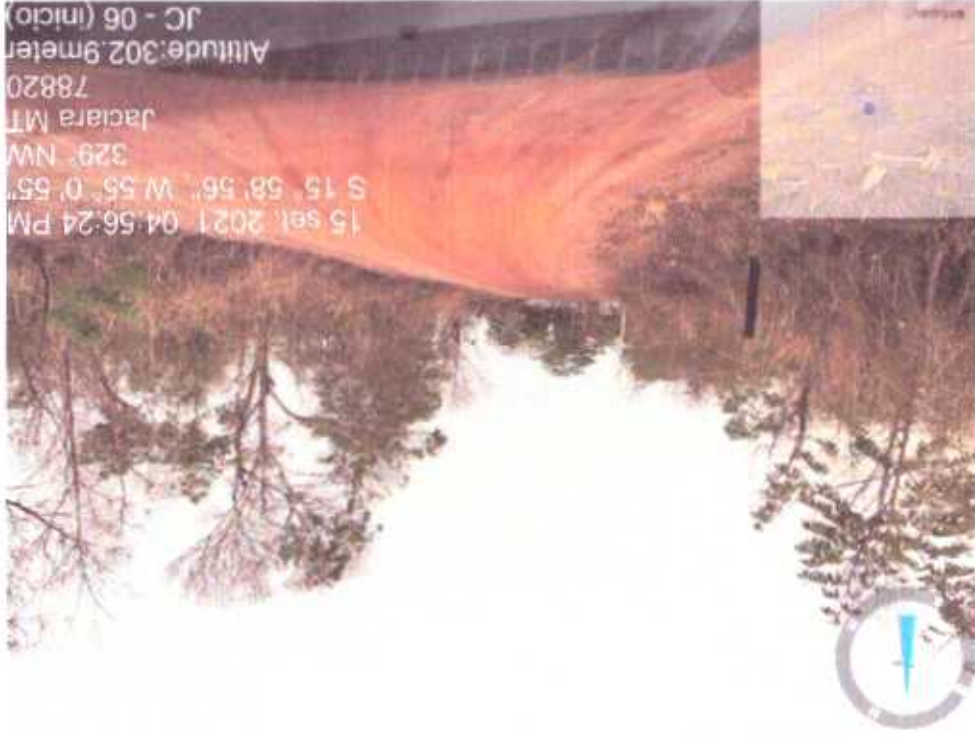

JC 15:

Detalhes: Início pela MT-140 ;

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°49'1.58"S Longitude 55°13'45.17"O
Final: Coordenada Geográfica: Latitude 15°58'47.63"S Longitude 55°18'25.69"O


Extensão total: 28,8 Quilômetros ou 28.000,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 12.873,00 Metros (início a Jazida) – 489 metros da Estrada Municipal JC15 ao ponto de extração.
Coordenada Geográfica: Latitude: 15°54'10.60"S Longitude: 55°13'47.00"O

Relatório Fotográfico



15 set 2021 03:12:37 PM
S 15° 48' 21" W 55° 13' 45"
353 N
BR-163
Jaciara MT
78820
Altitude: 601.6 meter
JC - 15 (início)

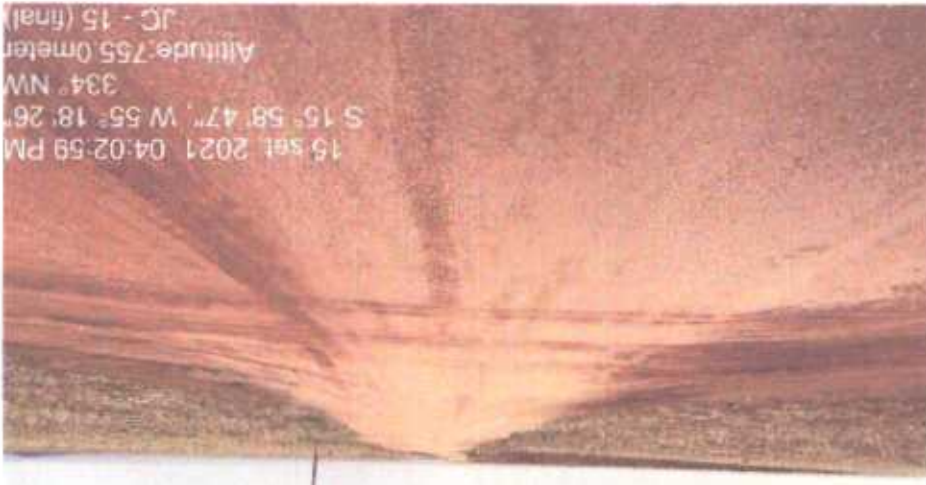

15 set 2021 04:02:59 PM
S 15° 58' 47" W 55° 18' 26"
334° NW
Altitude: 755.0 meter
JC - 15 (final)

55 B



PREFFITURA

CAMILA DOSS + 05267199150

THE CHAIRMAN: I am pleased to have you here today. I am sure that your presence will be a great asset to the committee. I am sure that you will be able to provide us with the information we need. I am sure that you will be able to provide us with the information we need. I am sure that you will be able to provide us with the information we need.

CREA MT 046807

56 B



JC 14:

Detalhes: Início BR 364 Acesso a MT-140 - Região da Usina Pantanal;

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°54'22.07"S Longitude 55°5'21.02"O

Final: Coordenada Geográfica: Latitude 15°55'35.24"S Longitude 55°13'39.15"O

Extensão total: 17,8 Quilômetros ou 17.800,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 6954,00 Metros (início a Jazida) - 126 metros da Estrada Municipal JC14 ao ponto de extração.

Coordenada Geográfica: Latitude: 15°55'39.66"S Longitude: 55°7'47.58"O

Relatório Fotográfico:





JC 45:

Detalhes: MT-140 – Chapadão do Prata

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 16°14'23.03"S Longitude 55°17'23.13"O
Final: Coordenada Geográfica: Latitude 16°19'36.53"S Longitude 55°24'54.43"O

Extensão total: 16.000,00 Quilômetros ou 16,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 2.198,00 Metros (início a Jazida) – 485,13 metros da Estrada Municipal JC45 ao ponto de extração.
Coordenada Geográfica: Latitude: 16°14'38,48"S Longitude: 55°18'29,28"O

Relatório Fotográfico:





JACIARA

PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 2ª ETAPA

LOCAL: JC 02, JC 03, JC 05, JC 08, JC 14, JC 20, JC 23, JC 24, JC 25, JC 29, JC 45, JC 15 e JC 06.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. ESCOPO

Manutenção e recuperação de estradas não pavimentadas (vias) com aplicação de cascalho de base, em que deverá ser feito o corte, carga, transporte e espalhamento do cascalho e nivelamento, bem como a drenagem em pontos ao longo da pista para escoamento superficial de águas pluviais.

A camada de cascalho não poderá ser inferior a 10 cm.

Estas especificações estabelecem os requisitos mínimos para a execução das obras de recuperação de estradas.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TRECHOS:

JC 02 - Adequação de estrada, numa extensão de 2,10KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 10.500,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 1.050,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°59'38,73"S 54°57'17.82"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 75 cargas.

JC 03 - Adequação de estrada, numa extensão de 12,0KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 60.000,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 6.000,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 16°3'15,20"S 54°58'21.35"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 429,00 cargas.

JC 05 - Adequação de estrada, numa extensão de 15,9KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 79.500,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 9.150,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°59'37,53"S 55°0'34.87"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 654,00 cargas.

JC 06 - Adequação de estrada, numa extensão de 1,7 KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 8.500,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 850m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°59'1,40"S 55°0'56.33"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 607,00 cargas.



JC 14 - Adequação de estrada, numa extensão de 17,80KM, com 7,00 m de largura média, totalizando 124.600,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 12.460,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°55'39,66"S 55°7'47,58"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 890,00 cargas.

JC 15 - Adequação de estrada, numa extensão de 28,8 KM, com 7,00 m de largura média, totalizando 201.600,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 20.160,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°54'10,60"S 55°13'47,00"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 1.440,00 cargas

JC 20 - Adequação de estrada, numa extensão de 9,33KM, com 7,00 m de largura média, totalizando 65.303,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 6.530,30m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°54'57,53"S 55°1'22,80"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 467,00 cargas

JC 23 - Adequação de estrada, numa extensão de 2,24KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 11.200,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 1.123,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°53'57,45"S 54°58'6,24"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 81,00 cargas.

JC 24 - Adequação de estrada, numa extensão de 11,40KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 57.000,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 5.687,50m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°50'54,77"S 55°1'31,54"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 407,00 cargas.

JC 25 - Adequação de estrada, numa extensão de 4,55KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 22.750,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 2.277,00³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°48'0,61"S 54°58'30,80"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 163,00 cargas.

JC 28 - Adequação de estrada, numa extensão de 7,96KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 39.800,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 3.988,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°48'52,83"S 55°3'23,68"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 285,80 cargas

JC 29 - Adequação de estrada, numa extensão de 9,2KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 46.000,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 5.087,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°47'2,88"S 55°3'58,29"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 364,00 cargas.

JC 45 - Adequação de estrada, numa extensão de 16,0 KM, com 7,00 m de largura média, totalizando 112.000,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 11.200,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 16°14'38,48"S 55°18'29,28"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 800 cargas



3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO:

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de materiais, equipamentos e pessoal indispensável para a realização da obra.

Os serviços de mobilização de pessoal, ferramentas e equipamentos deverão ser realizados segundo um programa aprovado pela fiscalização, devendo antes do início dos mesmos, serem apresentados os planos de execução dos serviços, bem como a relação dos equipamentos que serão utilizados.

A empreiteira deverá providenciar os acessos e a instalação do canteiro de modo a atender as necessidades da obra. Caso haja acessos alternativos, serão também providenciados pela empreiteira, sendo tal custo considerado como parte da verba destinada a mobilização.

Os serviços serão medidos e pagos em conformidade com a planilha de obra, compreendendo o fornecimento de equipamentos e materiais, mão de obra e tudo o que se fizer necessário para a execução dos mesmos.

4. OBJETIVO

Esta especificação de serviço define os critérios que orientam a execução de regularização do subleito.

5. GENERALIDADE

Regularização do subleito é o conjunto de operações com motoniveladora que visa conformar a camada final da terraplenagem, nos aterros, mediante cortes, no sentido de dar um melhor acabamento, devendo ser executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados. Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de materiais, equipamentos e pessoal indispensável para a realização da obra.

6. MATERIAIS

Os materiais da última camada de terraplanagem, devem apresentar características iguais ou superiores às especificadas para a camada final de terraplanagem, obedecendo os seguintes limites:

Diâmetro máximo das partículas igual ou inferior a 76 mm;

Índice de Suporte Califórnia (ISC), igual ou superior ao considerado para o subleito, no dimensionamento do pavimento determinado com a energia do Proctor Normal.

Expansão, determinada no ensaio de Índice de Suporte Califórnia com a energia do Proctor Normal, inferior a 2%.



7. EQUIPAMENTOS

Todo equipamento deve ser inspecionado pela fiscalização, para que se obtenha a aprovação, para a autorização para o início dos serviços.

O equipamento básico para a execução da regularização do subleito é o seguinte:

- Moto niveladora com escarificador.

8. EXECUÇÃO

Inicialmente deve ser procedida uma verificação geral mediante o nivelamento geométrico comparando-se as cotas da superfície existente (camada final de terraplanagem), com as cotas previstas no projeto.

Após a marcação, proceder-se a regularização através de motoniveladora, até atingir a cota estabelecida, somente através da operação de corte, sendo vedada a correção de depressões por adição de material.

As raízes e blocos de pedra diâmetro superior a 76 mm e outros materiais estranhos devem ser removidos.

Caso seja necessário bota-fora de material, o mesmo deve ser feito lançando-se o excesso em locais que não causam prejuízos ao meio ambiente, à drenagem ou às obras de arte, ou em locais a serem indicados pela fiscalização.

A fiscalização poderá autorizar a liberação ao tráfego, desde que tal fato não prejudique a qualidade do serviço.

9. DRENAGEM SUPERFICIAL

Para assegurar a drenagem da estrada, deverão ser abertas nas laterais de seu leito, valetas de escoamento de águas pluviais (bigodes) com espaçamento de 200 (duzentos metros) em ambos os lados da rodovia.

Comprimento de 3,0 metros, largura de 1,0 metros e profundidade de 0,50 metros.

Com o objetivo de conduzir as águas que percorrem a via, mantendo a estabilidade do volume e velocidade das águas pluviais, diretamente ligada a faixa de rolagem.

Nos trechos de declividade acentuada e/ou com o nível da estrada inferior aos de suas bordas deverão ser executadas bacias de acumulação e amortecimento de águas pluviais, espaçadas com distâncias que amenizem a erosão no trecho.

SICRO 4805757: Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria
Equipamentos previstos em Mobilização.



10. MANEJO AMBIENTAL

Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio ambiente, no decorrer das operações destinadas à execução da regularização do subleito são:

Na exploração e ocorrência de materiais:

- a) atendimento às recomendações preconizadas na especificação de terraplanagem e empréstimos;
- b) As estradas de acesso devem seguir as recomendações da especificação de terraplanagem e caminho de serviços.

Na execução: os cuidados se referem à disciplina do tráfego e do estacionamento dos equipamentos.

a) Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências de drenagem na drenagem natural;

b) As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos devem ser localizadas de forma que os resíduos de lubrificantes e de combustíveis não sejam conduzidos até o curso d'água.

11. CONTROLE

Controle Tecnológico

Os locais para a realização dos ensaios de controle devem ser de livre escolha e fiscalização e devem ser procedidos os seguintes ensaios:

- a) uma determinação de massa específica aparente seca, "in situ" a cada 100m, ou quando for julgado conveniente pela fiscalização;
- b) uma determinação do teor de umidade, a cada 500m, ou quando for julgado conveniente pela fiscalização.

Controle Geométrico e de Acabamento

- a) Controle de cotas: após a execução dos serviços, devem ser procedidos a recolocação e o nivelamento do eixo e dos bordos a cada 20m, pelo menos, envolvendo no mínimo três pontos de seção transversal;
- b) controle de largura: deve ser determinada a largura da plataforma acabada, por medidas à trena executadas a cada 20m, no mínimo;
- c) controle de acabamento da superfície: as condições de acabamento da superfície devem ser apreciadas pela fiscalização em bases visuais.
- d) o acabamento transversal deve estar situado na faixa de aproximadamente 0,5% em relação ao definido no projeto, não se admitindo situações que permitam o acúmulo de água;



12. MEDIÇÃO

Os serviços devem ser medidos levando-se em consideração a área regularizada, expressa em metros quadrados.

No cálculo da área deve ser considerada a largura da plataforma do projeto.


13. PAGAMENTO

Os serviços executados devem ser pagos, mediante medição, com base nos preços unitários contratuais, os quais devem representar a compensação integral para todas operações de transporte de materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, encargos eventuais para realização dos serviços.

Jaciara, 20 de Setembro de 2021

CAMILA DOSS
05267199150
CAMILA DOSS
Eng. Civil CREA
046807

Estradas Municipais Jaciara MT

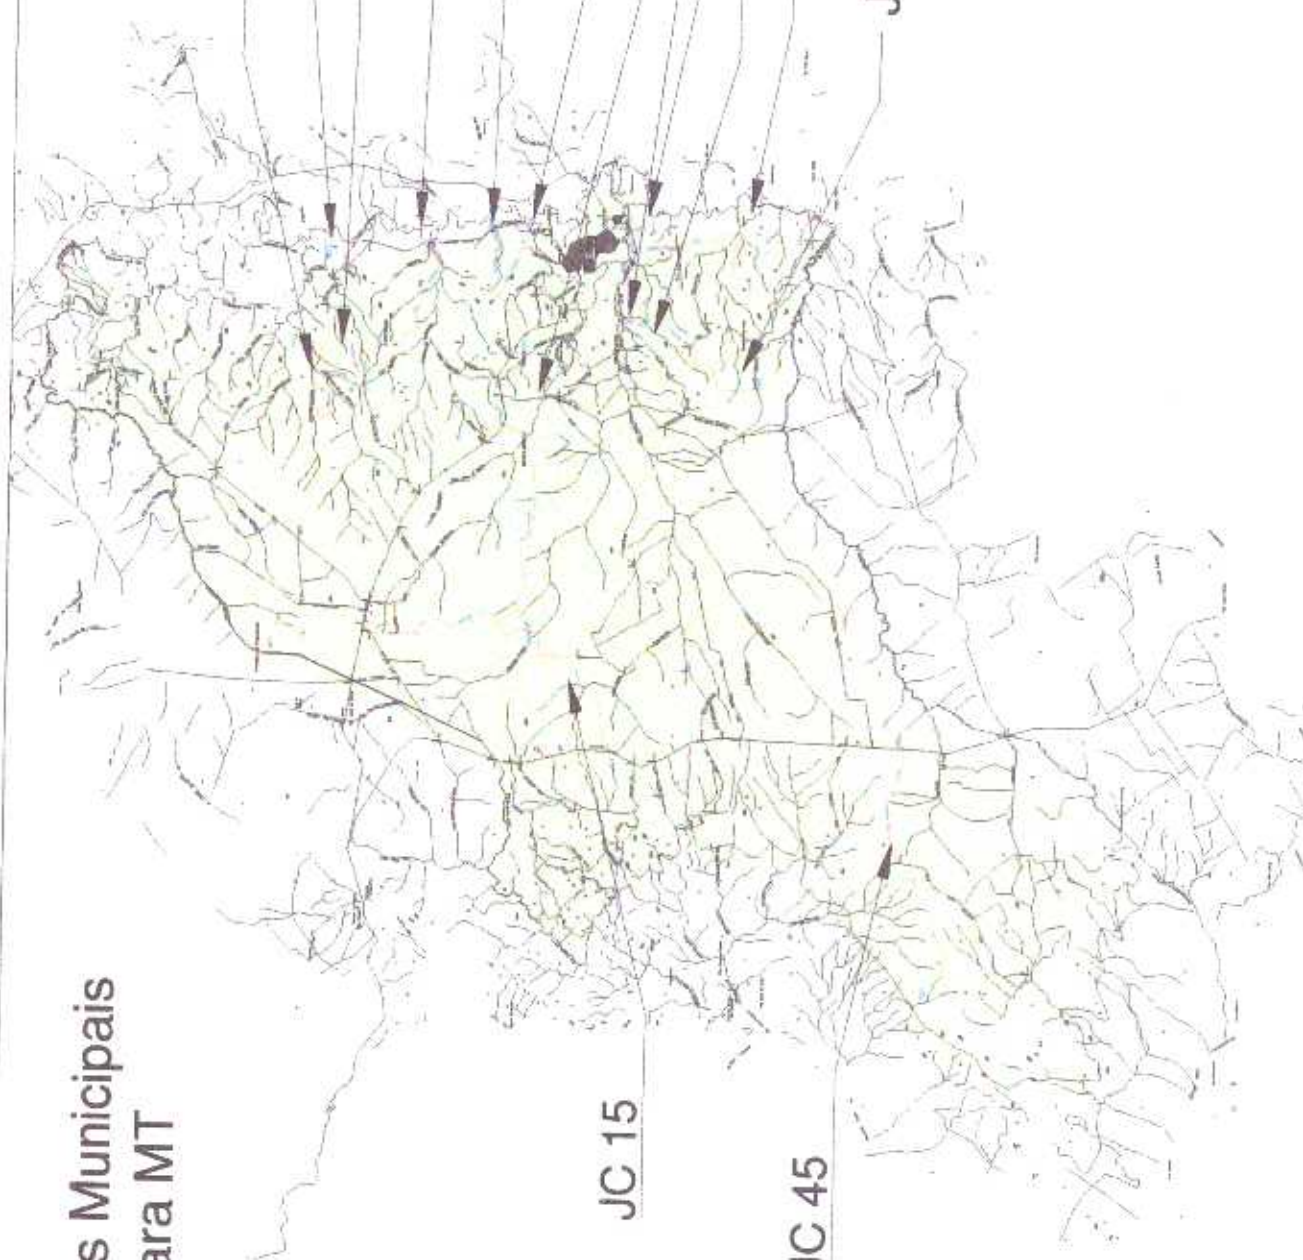

66

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	
Mapa: Projeto Municipal - Alameda Estádio Veloso nº 01/02 Escala: 1:100.000 Data: 11/05/2009	Assinatura:  ROSÂNGELA RUA: 11/05/2009
Assinatura:  CAMILLA RUA: 05/07/2009	Assinatura:  ROSÂNGELA RUA: 05/07/2009
Assinatura:  ROSÂNGELA RUA: 05/07/2009	

OBJETIVO:	
Estradas Municipais Não Pavimentadas - Município de Jaciara	
OBRA:	EXTENSÃO TOTAL (KM)
10' 42" 30' 03" 00' 45" 30' 30" 00' 30" 00' 30"	



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220210130801

67

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

CAMILA DOSS

RNP: 1218656682

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Registro: 48807

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JACIARA - PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Rua: AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO

Bairro: CENTRO

Número: 1075

Cidade: JACIARA

UF: MT

País: Brasil

Contrato:

Celebrado em: 12/04/2021

CEP: 78.820-000

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Vinculado à ART

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Lugradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JACIARA	ZONA RURAL	00		JACIARA	MT	BRA	78.820-000	015°55'00.00" S 054°57'00.00" O
Data de Início: 12/04/2021		Previsão Término: 17/09/2022			Código:			
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: MUNICÍPIO DE JACIARA - PREFEITURA MUNICIPAL			CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16			
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Projeto	de infraestrutura rodoviária		117,7200	quilômetro
	Elaboração de orçamento	de infraestrutura rodoviária		117,7200	quilômetro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONVÊNIO Nº 908656/2020 MAPA - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 2ª ETAPA

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local: CAMILA DOSS: 05267199150
052.671.991-50 - CAMILA DOSS
ANDREIA WINKLER 052672112
03.347.135/0001-16 - MUNICÍPIO DE JACIARA - PREFEITURA MUNICIPAL

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br e info@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

Valor ART: R\$ 88,78

Registrada em 04/08/2021

Valor Pago: R\$ 88,78

Número: 14000000004541184



JACIARA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

QUANTIDADE TOTAL:	62,48	QUILÔMETROS	BDI	21,35%
SICRO - 01/2021 / NÃO DESONERADO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORA) 70,52%(MÊS)			
Estradas: JC-29/JC-14-JC-20/JC-23/JC-24/JC-25/JC-28				

LOTE 01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 51.972,31
1.1	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,58	76.479,58	92.807,70	51.972,31
2.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 9.938,75
2.1	Composição 03	Mobilização e Desmobilização	UN	0,58	14.622,32	17.744,19	9.938,75
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.989,49
3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	20,16	285,70	346,70	6.989,49
4.0		LIMPEZA DE MATERIAL DE JAZIDA					R\$ 10.150,22
4.1	5502985 - SICRO	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	25.375,64	0,33	0,40	10.150,22
5.0		- TERRAPLENAGEM:					R\$ 370.894,22
5.1	5501886 - SICRO	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	33.752,80	8,39	10,18	343.603,51
5.2	5501882 - SICRO	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 1.400 a 1.800 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	2.277,00	6,96	8,43	19.195,11
5.3	5501877 - SICRO	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 400 a 800 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	1.123,00	5,83	7,20	8.085,60
6.0		- REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 332.889,08
6.1	4015612 - SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	37.152,80	7,38	8,96	332.889,08
7.0		SAÍDA D'ÁGUA					R\$ 4.983,18
7.1	4805757 - SICRO	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1842,00	4,36	5,29	4.983,18

Total Geral (R\$)	R\$ 767.805,40
Valor do km (R\$/km) ESTRADA	R\$ 12.608,82

CAMILA DOSS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 046807

CAMILA DOSS
05267199150

ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT 046807

68 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA - MT

2004 - REGISTRAÇÃO DE COMBUSTÍVEL - MUNICÍPIO DE JACIARA - MT

9467 IL CS

QUANTOMETROS

QUILÔMETROS

QUANTIDADE TOTAL
SICRO - 01/2011 : NÃO DESCONTADO
Subtotal: 1172425,14 R\$ - 2010: 2010-7642-2502-28

PROGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - NÃO DESONERADO

LOTE 01

[illegible]

CAROL A. DODD
WILKINSON
CHIEF, MT. CARMEL

CAMILA DOSS:
05267199150

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



JACIARA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICÍPIO DE JACIARA - MT

EXTENSÃO	17.800,00 M OU 17,8 KM	SICRO 01/2021 / NÃO DESONERADO	21,35%
		BDI	

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORA) 70,528%(MÊS)

JC - 14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	LN	0,08	76.479,36	92.807,70	R\$ 7.424,62
1.1	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 7.424,62
2.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	LN	0,08	14.622,32	17.744,18	R\$ 1.419,54
2.1	Composição 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 1.419,54
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	2,88	285,70	346,70	R\$ 998,60
3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					R\$ 998,60
4.0		LIMPEZA DE MATERIAL	M2	8.306,67	0,33	0,40	R\$ 3.322,67
4.1	5502985 - SICRO	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL					R\$ 3.322,67
5.0		- TERRAPLENAGEM:	M3	12.460,00	8,36	10,18	R\$ 126.842,80
5.1	5501886 - SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL					R\$ 126.842,80
6.0		- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	12.460,00	7,36	8,96	R\$ 111.641,60
6.1	4015612 - SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA					R\$ 111.641,60
7.0		SADAS D'ÁGUA	N3	267,00	4,36	5,29	R\$ 1.412,43
7.1	4805757 - SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA					R\$ 1.412,43
Total Geral (R\$)							R\$ 263.062,16
Valor do km (R\$/km) ESTRADA							R\$ 1.386,13

CAMILA DOSS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - MT 048677

10

10

418


JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 14

CÁLCULO DMT

A	B	C
126,00	6.954,00	10.846,00
DMT =>	4.662,75	metros

3.0 PLACA DA OBRA

COMP(M) LARG(M)

Considerada 01 placa no início do trecho

2,40	1,20	2,88
	1,00	2,88

4.0 LIMPEZA DE MATERIAL

4.1 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

VOL(M3) ESP(M) ÁREA(M2)

Área de Limpeza da Jazida

12.460,00	1,500	8.306,67
	TOTAL	8.306,67

Comprimento / Estrada Vicinal JC-14

17.800,00	17.800,00
-----------	-----------

Largura do revestimento primário

7,00

Espessura do revestimento primário

0,10

Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal

12.460,00

TOTAL 328,00

5.0 - TERRAPLENAGEM:

5.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL

COMP(M) LARG(M) ESP(M) VOL(M3)

Comprimento / Estrada Vicinal JC-14

17.800,00	7,00	0,100	12.460,00
17.800,00		TOTAL	12.460,00

Jazida - 1 (6,95 km, até a entrada estrada vicinal(material / seixo ==> densidade = 1,5 t/m3))

VOL(M3) DEN(T/M3) DMT(M) MON(T KM)

DMT = $125 + \frac{(6954^2 + 10846^2)}{2 \cdot (6954 + 10846)} = 4.662,75m \Rightarrow 4,66 km$

12.460,00	1,750	4,66	102.191,94
-----------	-------	------	------------

6.0 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6.1 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA

COMP(M) LARG(M) ALTURA(M) ÁREA(M2)

17.800,00	7,00	0,10	12.460,00
		TOTAL	12.460,00

7.0 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

COMP(M) LARG(M) ALTU(M) VOL(M3)

COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)= 17800/200=89 LOGO, 89 VEZES LATERAL DIREITA, 89 VEZES LATERAL ESQUERDA

3,00	1,00	0,500	1,50
178	3,00	TOTAL	287,00

 CAMILA DOSS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT - 046807

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

EXTENSÃO:

9.329,00 METROS OU 9,33 QUILOMETROS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORA) 70,52%(MÊS)

JC - 20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
------	------------	----------	-------	--------	---------------------	---------------------	-------------

1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,08	78.479,36	92.807,70	7.424,82

2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
2.1	Composição 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,06	14.522,32	17.744,18	1.419,54

3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	285,70	346,70	998,50

4.0	LIMPEZA DE MATERIAL						
4.1	5602985 - SICRO	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	4.353,53	0,33	0,40	1.741,41

5.0	- TERRAPLENAGEM						
5.1	6601686 - SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	6.530,30	8,39	10,18	66.478,46

6.0	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO						
6.1	4015612 - SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	6.530,30	7,36	8,96	58.511,49

7.0	SABIAS D'ÁGUA						
7.1	4805757 - SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	141,00	4,36	5,29	745,89

Total Geral (R\$) R\$ 137.319,90

Valor do km (R\$/km) ESTRADA R\$ 14.718,10

CAMEA DOSS
PROFESSORA CIVIL
CREA - MT 048807

25

Y3 B


JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 20

CÁLCULO DMT					
	A	B	C		
	59,70	531,00	8.798,00		
	DMT =>	4.166,06	metros		
3.0	PLACA DA OBRA	COMP(M)	LARG(M)		
	Considerada 01 placa no início do trecho	2,40	1,20	2,88	
			1,00	2,88	
4.0	LIMPEZA DE MATERIAL				
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	VOL(M3)	ESP(M)	ÁREA(M2)	
	Área de Limpeza da Jazida	6.530,30	1,500	4.353,53	
			TOTAL	4.353,53	
	Comprimento / Estrada Vicinal JC-20	9.329,00	9.329,00		
	Largura do revestimento primário	7,00			
	Espessura do revestimento primário	0,10			
	Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal:	6.530,30			
6.0	- TERRAPLENAGEM:				
5.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	COMP(M)	LARG(M)	ESP(M)	VOL(M3)
	Comprimento / Estrada Vicinal JC-20	9.329,00	7,00	0,100	6.530,30
		9.329,00		TOTAL	6.530,30
	Jazida - 1 (0,59km, até a entrada estrada vicinal) (material: solo ==> densidade = 1,5 ton/m3)	VOL(M3)	DEN(T/M3)	DMT(KM)	MON(T.KM)
	DMT= $59,7 * \frac{(631^2 + 8798^2)}{[2*(631+8798)]}$ = 4.166,06m => 4,1 km	6.530,30	1,700	4,10	47.122,64
6.0	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
6.1	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	COMP(M)	LARG(M)	ALTURA(M)	ÁREA(M3)
		9.329,00	7,00	0,10	6.530,30
				TOTAL	6.530,30
7.0	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	COMP(M)	LARG(M)	ALTU(M)	VOL(M3)
	COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)=9329/200=46,64 LOGO, 47 VEZES LATERAL DIREITA, 47 VEZES LATERAL ESQUERDA	3,00	1,00	0,500	1,50
		3,00		TOTAL	141,00
CAMILA DOSS					
ENGENHEIRA CIVIL					
CREA MT - 046807					



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

EXTENSÃO:

2.246,00 METROS OU 2,24 QUILOMETROS

SICRO: 01/2021 / NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORAY 70,526%IME/S)

JC - 23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,08	76.479,36	92.607,70	7.424,62
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
2.1	Composição 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,06	14.622,32	17.744,16	1.419,54
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,80	285,70	340,70	998,50
4.0	LIMPEZA DE MATERIAL						
4.1	0502985 - SICRO	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	748,67	0,33	0,40	299,47
6.0	- TERRAPLENAGEM:						
6.1	5501877 - SICRO	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 400 a 600 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	1.123,00	5,50	7,20	8.085,60
6.0	- REVESTIMENTO PRIMARIO						
6.1	4016612 - SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.123,00	7,38	8,96	10.067,08
7.0	SADAS D'ÁGUA						
7.1	4805757 - SICRO	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	36,00	4,36	5,28	190,44
							Total Geral (R\$)
							R\$ 28.480,26
							Valor do km (R\$/km) ESTRADA
							R\$ 12.714,40

CAMELA TOSSA
PREFEITA MUNICIPAL
CRLV - MT 049907

478


JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 23

CÁLCULO DMT

A	B	C
99,00	1.205,00	1.044,00
DMT =>	665,91	metros

3.0 PLACA DA OBRA

COMP(M) LARG(M)

Considerada 01 placa no início do trecho

2,40	1,20	2,88
	1,00	2,88

4.0 LIMPEZA DE MATERIAL

4.1 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

VOL(M3) ESP(M) ÁREA(M2)

Área de Limpeza da Jazida

1.123,00	1,500	748,67
	TOTAL	748,67

Comprimento / Estrada Vicinal JC-23

2.246,00

Largura do revestimento primário

5,00

Espessura do revestimento primário

0,10

Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal

1.123,00

5.0 - TERRAPLENAGEM

5.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 400 a 600 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL

COMP(M) LARG(M) ESP(M) VOL(M3)

Comprimento / Estrada Vicinal JC-23

2.246,00	5,00	0,100	1.123,00
2.246,00		TOTAL	1.123,00

Jazida = 1 (0,1209km, até a entrada estrada vicinal) (material / solo ==> densidade = 1,5 ton/m3)
DMT = $99 + \frac{((1205^2 + 1044^2) / (2 * (1205 + 1044)))}{1} = 665,905m \approx 0,66 km$

VOL(M3)	DEN(T/M3)	DMT(KM)	MON(T.KM)
1.123,00	1,760	0,66	1.106,63

6.0 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6.1 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA

COMP(M) LARG(M) ALTURA(M) ÁREA(M2)

2.246,00	5,00	0,10	1.123,00
		TOTAL	1.123,00

7.0 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

COMP(M) LARG(M) ALTUM) VOL(M3)

COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)=2246/200=11,23 LOGO, 12 VEZES LATERAL DIREITA, 12 VEZES LATERAL ESQUERDA

3,00	1,00	0,500	1,50
24	3,00	TOTAL	36,00

 CAMILA DOSS
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA MT - 046807



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

EXTENSÃO:

11,375,00 METROS OU 11,40 QUILOMETROS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORAS) 70,52%(MÊS)

JC - 24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,08	76.479,36	92.807,70	7.424,62
2.0	Composição 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,08	14.623,32	17.744,18	1.419,54
2.1	Composição 03	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	0,08	285,70	346,70	988,50
3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,86	285,70	346,70	988,50
4.0	Composição 02	LIMPEZA DE MATERIAL	M2	0,33	0,40	0,40	1.515,57
4.1	Composição 02	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	3.791,57	0,33	0,40	1.515,57
5.0	Composição 02	- TERRAPLENAGEM:					
5.1	Composição 02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - CMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	5.687,50	8,39	10,18	67.888,75
5.2	Composição 02	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
5.3	Composição 02	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	5.687,50	7,38	8,96	50.960,00
7.0	Composição 02	SABIAS D'ÁGUA					
7.1	Composição 02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	171,00	4,36	5,29	904,59
							RS 10.624,80
							Valor do km (R\$/km) ESTRADA
							RS 121.122,67
							Total Geral (R\$)

CAMILA DOS
SANTOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - MT 048807

875

YYB


JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 24

CÁLCULO DMT				
	A	B	C	
	365,00	3.826,00	7.549,00	
DMT =>		3.147,89	metros	
	COMP(M)	LARG(M)		
3.0 PLACA DA OBRA		2,40	1,20	2,88
Considerada 01 placa no início do trecho			1,00	2,88
	VOL(M3)	ESP(M)	ÁREA(M2)	
4.0 LIMPEZA DE MATERIAL				
4.1 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	5.687,50	1,500	3.791,57	
Área de Limpeza da Jazida			TOTAL	3.791,57
	11.375,00	11.375,00		
Comprimento / Estrada Vicinal JC-24	5,00			
Largura do revestimento primário	0,10			
Espessura do revestimento primário	5.687,50			
Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal:				
5.0 - TERRAPLENAGEM:				
5.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M -	COMP(M)	LARG(M)	ESP(M)	VOL(M3)
CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	11.375,00	5,00	0,100	5.687,50
Comprimento / Estrada Vicinal JC-24	11.375,00		TOTAL	5.687,50
	VOL(M3)	DEN(T/M3)	DMT(KM)	MON(T x KM)
Jazida = 1 (3.83km, até a entrada estrada vicinal) / material = solo => densidade = 1,6 ton/m³	5.687,50	1,200	3,10	31.031,00
DMT = $365 + \frac{((3826^2 + 7549^2) - (2 \cdot 3826 \cdot 7549))}{2 \cdot 3.147,89} = 3.147,89m \Rightarrow 3,1 km$				
6.0 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
6.1 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	COMP(M)	LARG(M)	ALTURA(M)	ÁREA(M2)
	11.375,00	5,00	0,10	5.687,50
			TOTAL	5.687,50
	COMP(M)	LARG(M)	ALTU(M)	VOL(M3)
7.0 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA				
COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS) = 11375/200 = 56,876 LOGO, 57 VEZES LATERAL DIREITA,	3,00	1,00	0,500	1,50
57 VEZES LATERAL ESQUERDA	114	3,00		171,00
			TOTAL	171,00
CAMILA DOSS ENGENHEIRA CIVIL CREA MT - 046807				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

SICRO 01/2021 / NÃO DESONERADO

4.554,00 METROS OU 4,55 QUILOMETROS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORA) 70,528%(MES)

JC - 25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		UN	0,08	76.479,36	92.807,70	7.424,62
1.1	Composição 01		UN	0,08	76.479,36	92.807,70	7.424,62
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
2.1	Composição 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,08	14.627,32	17.744,18	1.419,54
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,80	285,70	348,70	988,50
4.0	LMPEZA DE MATERIAL						
4.1	5502985 - SICRO	LMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	2.125,20	0,33	0,40	860,08
5.0	- TERAPIA PLANEJADA						
5.1	5501882 - SICRO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 1.400 a 1.600 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	2.277,00	6,95	6,43	19.196,11
6.0	- REVESTIMENTO PRIMARIO						
6.1	4015612 - SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JATUA	M2	2.277,00	7,36	6,96	20.401,92
7.0	SALDAIS D'ÁGUA						
7.1	4806797 - SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	69,00	4,36	5,29	366,01
							Total Geral (R\$)
							R\$ 50.664,78
							Valor do km (R\$/km) ESTRADA
							R\$ 11.132,92

CAMILA DOS SANTOS
ENQ DE OBRA CIVIL
OCEA - VLT 348867

85
B

79



JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 25

CÁLCULO DMT				
	A	B	C	
	200,00	969,00	3.585,00	
DMT =>		1.514,20	metros	
3.0 PLACA DA OBRA		COMP(M)	LARG(M)	
Considerada 01 placa no início do trecho		2,40	1,20	2,88
			1,00	2,86
4.0 LIMPEZA DE MATERIAL				
4.1 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGÉTAL		VOL(M3)	ESP(M)	ÁREA(M2)
Área de Limpeza da Jazida		3.187,80	1,500	2.126,20
		2.277,00	TOTAL	2.126,20
Comprimento / Estrada Vicinal JC-25	4.554,00	4.554,00		
Largura do revestimento primário	5,00			
Espessura do revestimento primário	0,10			
Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal:	2.277,00			
6.0 - TERRAPLENAGEM:				
6.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT de 1.400 a 1.600 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	COMP(M)	LARG(M)	ESP(M)	VOL(M3)
Comprimento / Estrada Vicinal JC-25	4.554,00	5,00	0,100	2.277,00
	4.554,00		TOTAL	2.277,00
Jazida - 1 (0,9km. até a entrada estrada vicinal(material / seção ==> densidade = 1,5 ton/m3))	VOL(M3)	DEN(T/M3)	DMT(KM)	MON(T KM)
DMT= 200 + $\frac{(969^2 + 3585^2)}{(2 \cdot (969 + 3585))}$ = 1.514,208m => 1,5 km	2.277,00	1,700	1,50	6.011,28
6.0 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
6.1 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	COMP(M)	LARG(M)	ALTURA(M)	ÁREA(M2)
	4.554,00	5,00	0,10	2.277,00
			TOTAL	2.277,00
7.0 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	COMP(M)	LARG(M)	ALTU(M)	VOL(M3)
COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)=4554/200=22,77 LOGO, 23 VEZES LATERAL DIREITA, 23 VEZES LATERAL ESQUERDA	3,00	1,00	0,500	1,50
46	3,00		TOTAL	69,00
CAMILA DOS ENGENHEIRA CIVIL CREA MT - 046807				

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

7.978,00 METROS OU 7,98 QUILOMETROS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORA) 70,528%(MÊS)

JC - 28

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
------	------------	----------	-------	--------	---------------------	---------------------	-------------

[illegible]

3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,68	255,70	346,70	996,50
4.0		UNIDADE DE MATERIAL					
4.1	5502985 - SÍMBOLO	UNIDADE MECANIZADA DA CAMADA VERTICAL	M2	2.656,67	0,33	0,40	1.063,47
							1.063,47

[illegible]

6.1	4015612 - SICRO	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M2	1.988,00	7,18	14,98	35.732,48
7.0		SABOAS D'ÁGUA					
7.1	4805757 - SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	120,00	4,36	5,29	634,60
							634,60

[illegible]

Total Count (MS)

Valor do km (R\$/km) ESTRADA	R\$ 11.137,04
------------------------------	---------------

CAMILLA DOSS
 ENCERRADA CIVIL
 COM - MT 04807

80

81 B


JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 28

CÁLCULO DMT

A	B	C
170,00	173,00	7.803,00
DMT =>	3.818,76	metros

3.0	PLACA DA OBRA	COMP(M)	LARG(M)		
	Considerada 01 placa no início do trecho	2,40	1,20	2,88	
			1,00	2,88	
4.0	LIMPEZA DE MATERIAL				
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	VOL(M3)	ESP(M)	AREA(M2)	
	Área de Limpeza da Jazida	3.988,00	1,500	2.658,67	
			TOTAL	2.658,67	
	Comprimento / Estrada Vicinal JC28	7.976,00	7.976,00		
	Largura do revestimento primário	5,00			
	Espessura do revestimento primário	0,10			
	Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal:	3.988,00			
5.0	- TERRAPLENAGEM:				
5.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	COMP(M)	LARG(M)	ESP(M)	VOL(M3)
	Comprimento / Estrada Vicinal JC28	7.976,00	5,00	0,100	3.988,00
		7.976,00		TOTAL	3.988,00
	Jazida - 1 (0,17km, até a entrada estrada vicinal) material (solo ==> densidade = 1,5 ton/m3)	VOL(M3)	DEN(T/M3)	DMT(KM)	MON(T, KM)
	DMT= $170 + \frac{(173^2 + 7803^2)}{2 \cdot (173+7976)}$ = 3818,763m => 3,81 km	3.988,00	1,780	3,51	26.741,93
6.0	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO				
6.1	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	COMP(M)	LARG(M)	ALTURA(M)	AREA(M3)
		7.976,00	5,00	0,10	3.988,00
				TOTAL	3.988,00
7.0	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	COMP(M)	LARG(M)	ALTU(M)	VOL(M3)
	COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)=7976/200=39,88 LOGO, 40 VEZES LATERAL DIREITA, 40 VEZES LATERAL ESQUERDA	3,00	1,00	0,500	1,50
		80	3,00	TOTAL	120,00
	CAMILA DOSS				
	ENGENHEIRA CIVIL				
	CREA MT - 046807				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

OBRA: ADEQUACAO DE ESTRADA RURAL VICINAL 2ª ETAPA - MUNICIPIO DE JACIARA - MT

SICRO 01/2021 / NÃO DESONERADO

EXTENSÃO:

9.200,00 METROS OU 9,2 QUILOMETROS

BDI:

21,35%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,57%(HORA) 70,528%(MÊS)

JC - 29

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Composição	Serviços	Unid.	Quant.	Custo unit. sem BDI	Custo unit. com BDI	Total (R\$)
1.0	Composição 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,06	76.479,36	92.607,70	7.424,62
1.1							
2.0							
2.1	Composição 03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,06	14.622,32	17.744,16	1.419,54
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1	Composição 02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,60	266,70	346,70	999,60
4.0		LIMPEZA DE MATERIAL					
4.1		LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	3.391,33	0,33	0,40	1.366,53
5.0		- TERRAPLENAGEM					
5.1		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL	M3	5.067,00	8,39	10,16	51.765,66
5.0							
6.0		- REVESTIMENTO PRIMARIO					
6.1		EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M2	5.067,00	7,36	8,96	46.679,52
7.0		SABIAS D'ÁGUA					
7.1		ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	136,00	4,36	5,29	730,02
					Total Geral (R\$)		R\$ 109.294,39
					Valor do km (R\$/km) ESTRADA		R\$ 11.879,53

CAMALPOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA - MT 046607

828

23



JACIARA
PREFEITURA

MEMORIAL DE CÁLCULO - JC 29

CÁLCULO DMT

A	B	C
200,00	909,00	8.231,00
DMT =>	3.733,07	metros

3.0 PLACA DA OBRA

COMP(M)

LARG(M)

Considerada 01 placa no início do trecho

2,40

1,20

2,88

1,00

2,88

4.0 LIMPEZA DE MATERIAL

4.1 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

VOL(M3)

ESP(M)

ÁREA(M2)

Área de Limpeza da Jazida

5.087,00

1,500

3.391,33

TOTAL

3.391,33

Comprimento / Estrada Vicinal JC-29

10.174,00

10.174,00

Largura do revestimento primário

5,00

Espessura do revestimento primário

0,10

Volume de material de jazida necessário para cascalhamento da estrada vicinal

5.087,00

5.0 - TERRAPLENAGEM:

5.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL

COMP(M)

LARG(M)

ESP(M)

VOL(M3)

Comprimento / Estrada Vicinal JC-29

10.174,00

5,00

0,100

5.087,00

TOTAL

5.087,00

Jazida = $1 \times (4.7Km, \text{ até a entrada estrada vicinal} / \text{material / trecho} \Rightarrow \text{densidade} = 1,6 \text{ ton/m}^3)$

VOL(M3)

DEMT(M3)

DMT(KM)

MON(T KM)

DMT = $66 + \frac{((4705^2 + 8231^2) / (2 \times (4705 + 8231)))}{2} = 3.733,071m \Rightarrow 3,73km$

5.087,00

1,700

3,73

33.395,14

6.0 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

6.1 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA

COMP(M)

LARG(M)

ALTURA(M)

ÁREA(M2)

10.174,00

5,00

0,10

5.087,00

TOTAL

5.087,00

7.0 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

COMP(M)

LARG(M)

ALTU(M)

VOL(M3)

COMPRIMENTO TOTAL (A CADA 200 METROS)= $9200/200=46$ LOGO, 46 VEZES LATERAL DIREITA, 46 VEZES LATERAL ESQUERDA

3,00

1,00

0,500

1,50

92

3,00

TOTAL

138,00

CAMILA DOSS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MT - 046907

84 B



Estradas Municipais Não Pavimentadas - Município de Jaciara		
OBRA:	OBJETIVO:	EXTENSÃO TOTAL (KM)
ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL	FOMENTAR A AGROPECUÁRIA	138,98
	JC 45, JC 02, JC 25, JC 29, JC 24, JC 23, JC 20, JC 28, JC 05, JC 03, JC 14, JC 15, JC 06	


MT 457

90 cr

05 B



VISUALIZAÇÃO POR SATÉLITE

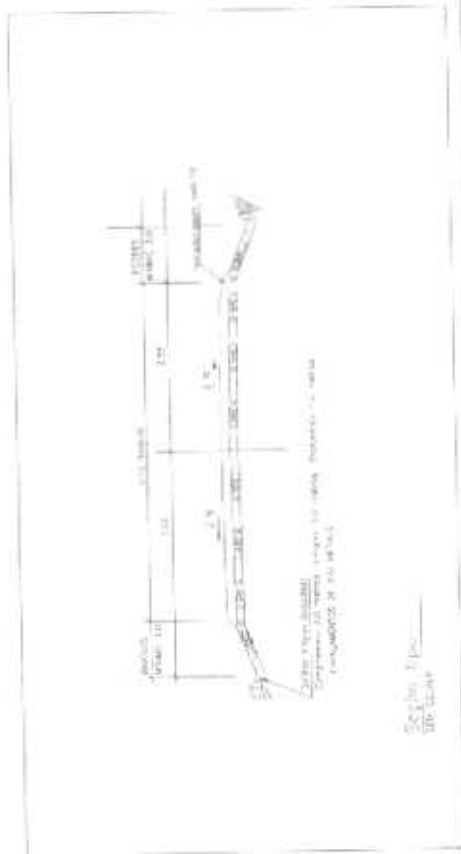

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÁ	SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Saúde - Associação Eclesiástica e Saúde - 2ª Etapa	SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Saúde - Associação Eclesiástica e Saúde - 2ª Etapa	SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Saúde - Associação Eclesiástica e Saúde - 2ª Etapa	SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Saúde - Associação Eclesiástica e Saúde - 2ª Etapa	SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Saúde - Associação Eclesiástica e Saúde - 2ª Etapa	SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Saúde - Associação Eclesiástica e Saúde - 2ª Etapa	SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Saúde - Associação Eclesiástica e Saúde - 2ª Etapa	SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Saúde - Associação Eclesiástica e Saúde - 2ª Etapa	SECRETARIA DE SAÚDE Unidade de Saúde - Associação Eclesiástica e Saúde - 2ª Etapa
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Estradas Municipais Não Pavimentadas		
ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL
JC - 15	1 at 15°58'55,48" S 1,0mg 55°0'54,59" O	1 at 15°59'47,69" S 1,0mg 55°0'54,81" O
		EXTENSAO (KM)
		1,7



VISUALIZAÇÃO POR SATÉLITE

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
EC - 15	Lat 15°58'53,48"S Long. 55°05'54,59"O	Proximidade a MI - 457	Lat 15°59'47,667"S Long. 55°05'54,81"O	1,7

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		Município de Jaciara - Mato Grosso Avenida Getúlio Vargas 200 - Centro - Jaciara - MT	
Nome do Contribuinte: <i>Paulo Roberto</i> CPF: 000.000.000-00 Endereço: Rua da Paz, 100 - Centro		Nome do Contribuinte: <i>Paulo Roberto</i> CPF: 000.000.000-00 Endereço: Rua da Paz, 100 - Centro	
Nome do Contribuinte: <i>Paulo Roberto</i> CPF: 000.000.000-00 Endereço: Rua da Paz, 100 - Centro		Nome do Contribuinte: <i>Paulo Roberto</i> CPF: 000.000.000-00 Endereço: Rua da Paz, 100 - Centro	
Nome do Contribuinte: <i>Paulo Roberto</i> CPF: 000.000.000-00 Endereço: Rua da Paz, 100 - Centro		Nome do Contribuinte: <i>Paulo Roberto</i> CPF: 000.000.000-00 Endereço: Rua da Paz, 100 - Centro	

JC 15

EXTENSÃO 38,4 KILOMETROS
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
INÍCIO Lat: 15°49'1.58"S Long: 55°18'25.69"O
FINAL Lat: 15°58'47.63"S Long: 55°18'25.69"O



VISUALIZAÇÃO POR SATELITE

Estradas Municipais Não Pavimentadas

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
JC - 15	Lat 15°49'1.58"S Long 55°18'25.69"O	Lat 15°58'47.63"S Long 55°18'25.69"O	28,8

LOCALIZAÇÃO RODOVIA
Proximidade a MT - 140

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINARA	
Nome: Meia Estrada Municipal - Alameda Estrada e suas 2ª Etapa	
Nome: Prefeitura Municipal de Jacinara	Endereço: Av. Brasil, 100 - Centro
CEP: 75.000-000	Fone: (65) 3333-1111
E-mail: prefeitura@jacinara.mt.gov.br	Site: www.jacinara.mt.gov.br
Responsável Técnico: Eng.º Civil - JACINARA	Responsável Técnico: Eng.º Civil - JACINARA
Assinatura: [Assinatura]	Assinatura: [Assinatura]
Data: 15/05/2017	Data: 15/05/2017

JC 15

88

DE ALFAMENIO S.p.A. VIA

COORDENADA GEOGRÁFICA - INICIO

CONFERÊNCIA GEOGRÁFICA - FINAL

15.9



VISUALIZAÇÃO POR SATELITE

89 89



100

Figure 1

100

100

Published Online First on June 14, 2011

ANDREIA

1-800-368-2767

1000

1

1000

© 1999 by The McGraw-Hill Companies

11

100

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

INTERNET

[illegible]

10

JC 05

90 8



VISUALIZAÇÃO POR SATELITE

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	
Rua do Espírito Santo - Associação Comunitária Verdes 2º Cortejo JACIARA - MT, 78.000-000	
Cnpj: 08.141.140/0001-10 Inscrição Estadual: 08.000.000-00 Inscrição Federal: 08.000.000-00	Inscrição Estadual: 08.000.000-00 Inscrição Federal: 08.000.000-00
Inscrição Estadual: 08.000.000-00 Inscrição Federal: 08.000.000-00	Inscrição Estadual: 08.000.000-00 Inscrição Federal: 08.000.000-00
Inscrição Estadual: 08.000.000-00 Inscrição Federal: 08.000.000-00	Inscrição Estadual: 08.000.000-00 Inscrição Federal: 08.000.000-00
Inscrição Estadual: 08.000.000-00 Inscrição Federal: 08.000.000-00	Inscrição Estadual: 08.000.000-00 Inscrição Federal: 08.000.000-00

Estradas Municipais Não Pavimentadas

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
JC - 05	Lat 15°58'59.49"S Long 54°59'1.91"O	Lat 16°5'43.65"S Long 55°5'18.34"O	15,9

LOCALIZAÇÃO RODOVIA
Proximidade a MT - 457

MT-457

Lat 15°59'6.20"S
Long 54°57'22.71"O

2.100 KM

Lat 15°59'54.42"S
Long 54°57'28.87"O

DETA LHAMENIO DA VA

Estradas Municipais Não Pavimentadas

ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
JC - 02	Lat 15°59'56" S Long 54°57'22" W	Proximidade a MT - 457	Lat 15°59'54" S Long 54°57'28" W	2,10



VISUALIZANDO EGN SATITE

Sample No. _____
Date: _____

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÃ	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÃ
Nome do Orgão: Município de Jacarã	Nome do Órgão: Município de Jacarã	Nome do Órgão: Município de Jacarã
Endereço: Rua do Comércio, 100	Endereço: Rua do Comércio, 100	Endereço: Rua do Comércio, 100
Cidade: Jacarã	Cidade: Jacarã	Cidade: Jacarã
CEP: 75.000-000	CEP: 75.000-000	CEP: 75.000-000
UF: MT	UF: MT	UF: MT
Telefone: (65) 3333-3333	Telefone: (65) 3333-3333	Telefone: (65) 3333-3333
E-mail: jacarã@jacarã.mt.gov.br	E-mail: jacarã@jacarã.mt.gov.br	E-mail: jacarã@jacarã.mt.gov.br
Site: www.jacarã.mt.gov.br	Site: www.jacarã.mt.gov.br	Site: www.jacarã.mt.gov.br
Assessoria: Assessoria Jurídica	Assessoria: Assessoria Jurídica	Assessoria: Assessoria Jurídica
Assessoria: Assessoria Jurídica	Assessoria: Assessoria Jurídica	Assessoria: Assessoria Jurídica

JC 02

EXTENSÃO 1,75 QUILOMETROS
 Coordenadas Geográficas
 Inicio: Lat 15°59'20"S Long 54°57'22"O
 Final: Lat 15°59'54" S Long 54°57'28"O



VISUALIZAÇÃO POR SATELITE

Estradas Municipais Não Pavimentadas


ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INICIO	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
JC - 02	Lat 15°59'20"S Long 54°57'22"O	Lat 15°59'54" S Long 54°57'28"O	2,10

Proximidade a MT - 457

JC 02

94 8

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUARA	
Nome da Estrada: Mun. Estrada Municipal Número da Estrada: Adm. 2º Diga	Nome do Responsável: Carla Costa Cargo: Responsável Assinatura: CARLA COSTA Data: 00/07/2015
Nome do Responsável: Carla Costa Cargo: Responsável Assinatura: CARLA COSTA Data: 00/07/2015	Nome do Responsável: Carla Costa Cargo: Responsável Assinatura: CARLA COSTA Data: 00/07/2015
Nome do Responsável: Carla Costa Cargo: Responsável Assinatura: CARLA COSTA Data: 00/07/2015	Nome do Responsável: Carla Costa Cargo: Responsável Assinatura: CARLA COSTA Data: 00/07/2015

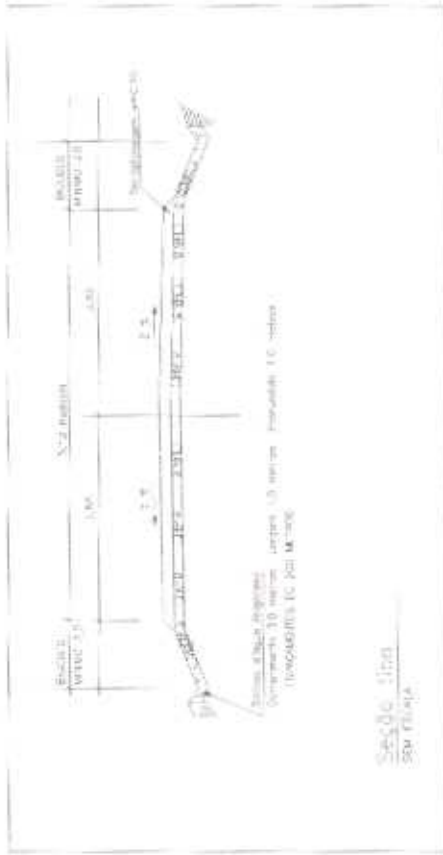

VISUALIZAÇÃO POR MATÉRIE



ESTRADA	COORDENADA GEOGRÁFICA - INÍCIO	LOCALIZAÇÃO RODOVIA	COORDENADA GEOGRÁFICA - FINAL	EXTENSÃO (KM)
AC - 45	Lat 16°14'23.03"S Long 55°17'23.13"O	Proximidade a MT - 140 Chapadão do Prata	Lat 15°19'36.53"S Long 55°24'54.43"O	16,00

 ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUARA	Nome: _____ Rua: _____ Município: _____	CPF: _____ Data de Nascimento: _____ Estado: _____	Assinatura: _____ Nome: _____ Cargo: _____ Data: _____	Assinatura: _____ Nome: _____ Cargo: _____ Data: _____	Assinatura: _____ Nome: _____ Cargo: _____ Data: _____
---	--	---	---	---	---

VISUALİZANDO O SEU SAÍD IT



JACIARA
PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024

Caracterização das Estradas Vicinais Inclusas na Proposta de
“Adequação de Estradas Vicinais - 2ª Etapa”

Contrato Repasse MAPA 908656/2020

Operação 1074472-49 – Prefeitura Municipal de Jaciara

Contém as Descrições das vias com Coordenadas Geográficas de Início/fim da via; Ponto de Jazida; Extensão das Vias; Relatório Fotográfico.

948



JACIARA

PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024

JC 28:

Detalhes: Proximidade da MT-457

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°48'52.90"S Longitude 55°3'31.29"O

Final: Coordenada Geográfica: Latitude 15°46'4.87"S Longitude 55°1'55.55"O

Extensão total: 7,96 Quilômetros ou 7.976,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 173,00 Metros (início a Jazida) – 170 metros da Estrada Municipal JC28 ao ponto de extração.

Coordenada Geográfica: Latitude: 15°48'52.83"S Longitude: 55°3'23.68"O

Relatório Fotográfico:



98
8b



JACIARA

PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024

JC 20:

Detalhes: MT-457 – Região Água Grande

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°55'11.36"S Longitude 54°57'29.26"O

Final: Coordenada Geográfica: Latitude 15°55'6.11"S Longitude 55°11'39.74"O

Extensão total: 9,33 Quilômetros ou 9.329,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 531,00 Metros (início a Jazida) – 59,7 metros da Estrada Municipal JC20 ao ponto de extração.

Coordenada Geográfica: Latitude: 15°54'57.53"S Longitude: 55°1'22.80"O

Relatório Fotográfico:



99
8



JACIARA

PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024

JC 23:

Detalhes: MT-457 – Região do Vinte e Sete

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°53'41.31"S Longitude 54°57'32.19"O

Final: Coordenada Geográfica: Latitude 15°53'54.04"S Longitude 54°58'39.28"O

Extensão total: 2,24 Quilômetros ou 2.246,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 1.205,00 Metros (início a Jazida) – 99,00 metros da Estrada Municipal JC23 ao ponto de extração.

Coordenada Geográfica: Latitude: 15°53'57.45"S Longitude: 54°58'6.24"O

Relatório Fotográfico:



100
8



JACIARA

PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024

JC 24:

Detalhes: MT-457 – Assentamento São Francisco

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°51'17.94"S Longitude 54°58'6.39"O


Final: Coordenada Geográfica: Latitude 15°49'25.22"S Longitude 55°2'15.01"O

Extensão total: 11,40 Quilômetros ou 11.375,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 3.826,00 Metros (início a Jazida) – 365,00 metros da Estrada Municipal JC24 ao ponto de extração.

Coordenada Geográfica: Latitude: 15°50'54.77"S Longitude: 55°1'31.58"O

Relatório Fotográfico:

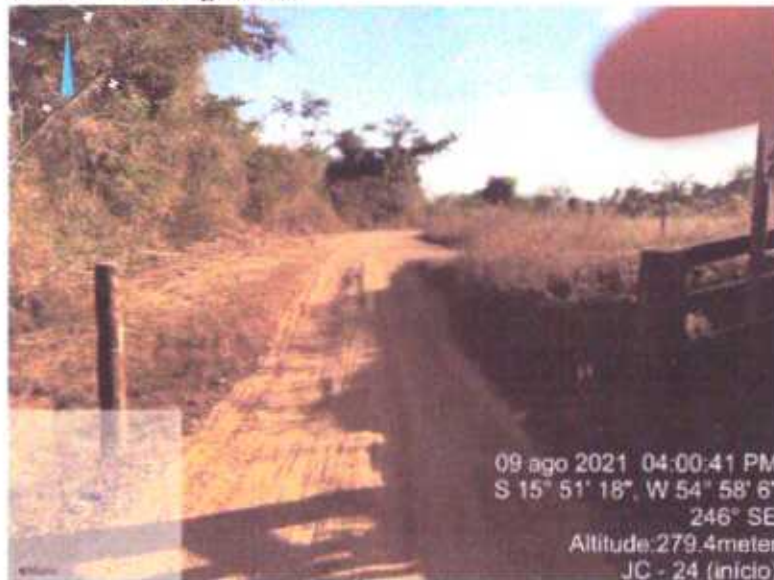

304
B



JACIARA

PREFEITURA
GESTÃO 2021/2024

JC 29:

Detalhes: MT-457 – Assentamento Plano Piloto

Início: Coordenada Geográfica: Latitude 15°48'49.47"S Longitude 55°3'50.50"O


Final: Coordenada Geográfica: Latitude 15°47'26.55"S Longitude 55°4'45.89"O

Extensão total: 9,2 Quilômetros ou 9.200,00 Metros

Ponto de extração de Jazida: 4.705,00 Metros (início a Jazida) – 66,00 metros da Estrada Municipal JC29 ao ponto de extração.

Coordenada Geográfica: Latitude: 15°47'2.88"S Longitude: 55°3'58.29"O

Relatório Fotográfico:

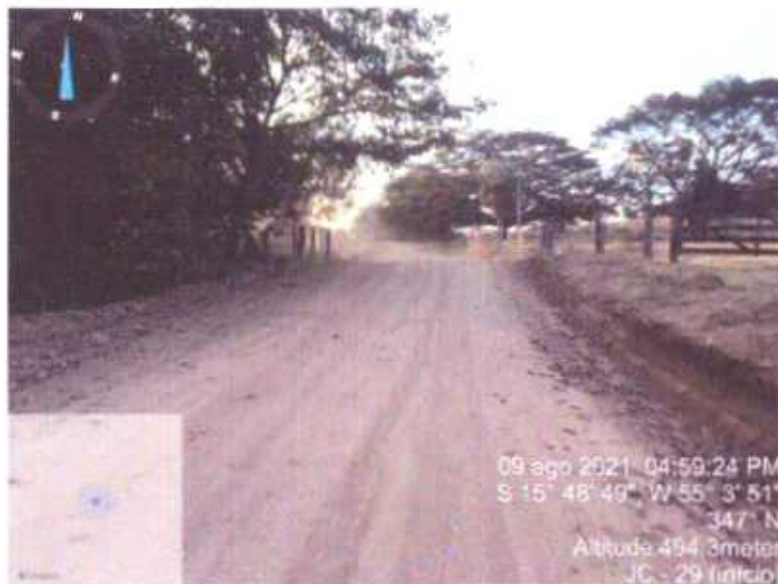

103
B



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 2ª ETAPA

LOCAL: JC 02, JC 03, JC 05, JC 08, JC 14, JC 20, JC 23, JC 24, JC 25, JC 29, JC 45, JC 15 e JC 06.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. ESCOPO

Manutenção e recuperação de estradas não pavimentadas (vias) com aplicação de cascalho de base, em que deverá ser feito o corte, carga, transporte e espalhamento do cascalho e nivelamento, bem como a drenagem em pontos ao longo da pista para escoamento superficial de águas pluviais.

A camada de cascalho não poderá ser inferior a 10 cm.

Estas especificações estabelecem os requisitos mínimos para a execução das obras de recuperação de estradas.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TRECHOS:

JC 02 - Adequação de estrada, numa extensão de 2,10KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 10.500,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 1.050,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°59'38,73"S 54°57'17.82"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 75 cargas.

JC 03 - Adequação de estrada, numa extensão de 12,0KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 60.000,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 6.000,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 16°3'15,20"S 54°58'21.35"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 429,00 cargas.

JC 05 - Adequação de estrada, numa extensão de 15,9KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 79.500,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 9.150,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°59'37,53"S 55°0'34.87"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 654,00 cargas.

JC 06 - Adequação de estrada, numa extensão de 1,7 KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 8.500,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 850m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°59'1,40"S 55°0'56.33"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 607,00 cargas.



JC 14 - Adequação de estrada, numa extensão de 17,80KM, com 7,00 m de largura média, totalizando 124.600,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 12.460,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°55'39,66"S 55°7'47,58"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 890,00 cargas.

JC 15 - Adequação de estrada, numa extensão de 28,8 KM, com 7,00 m de largura média, totalizando 201.600,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 20.160,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°54'10,60"S 55°13'47,00"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 1.440,00 cargas

JC 20 - Adequação de estrada, numa extensão de 9,33KM, com 7,00 m de largura média, totalizando 65.303,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 6.530,30m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°54'57,53"S 55°1'22,80"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 467,00 cargas

JC 23 - Adequação de estrada, numa extensão de 2,24KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 11.200,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 1.123,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°53'57,45"S 54°58'6,24"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 81,00 cargas.

JC 24 - Adequação de estrada, numa extensão de 11,40KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 57.000,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 5.687,50m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°50'54,77"S 55°1'31,54"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 407,00 cargas.

JC 25 - Adequação de estrada, numa extensão de 4,55KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 22.750,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 2.277,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°48'0,61"S 54°58'30,80"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 163,00 cargas.

JC 28 - Adequação de estrada, numa extensão de 7,96KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 39.800,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 3.988,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°48'52,83"S 55°3'23,68"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 285,80 cargas

JC 29 - Adequação de estrada, numa extensão de 9,2KM, com 5,00 m de largura média, totalizando 46.000,00m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 5.087,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 15°47'2,88"S 55°3'58,29"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 364,00 cargas.

JC 45 - Adequação de estrada, numa extensão de 16,0 KM, com 7,00 m de largura média, totalizando 112.000,00 m² de área, com espessura de 10 cm, necessitando 11.200,00m³ de material, partindo da jazida conforme coordenadas: 16°14'38,48"S 55°18'29,28"W considerando 14m³ de agregados por carga, necessitaremos aproximadamente 800 cargas



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220210130801

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

CAMILA DOSS

Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Empresa Contratada:

RNP: 121886662

Registro: 46807

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE JACIARA - PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16

Rua: AV. ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO

Bairro: CENTRO

Número: 1076

Cidade: JACIARA

UF: MT

País: Brasil

Contrato:

Celebrado em: 12/04/2021

CEP: 78.820-000

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO

Vinculado a ART:

Ação (Institucional):

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JACIARA	ZONA RURAL	00		JACIARA	MT	BRA	78.820-000	013°55'00.00" S 054°57'00.00" O
Data de Início: 12/04/2021		Previsão Término: 17/08/2022			Código:			
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		Proprietário: MUNICÍPIO DE JACIARA - PREFEITURA MUNICIPAL			CPF/CNPJ: 03.347.135/0001-16			
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Atividades de Infraestrutura Rodoviária					
	Projeto	de infraestrutura rodoviária		117,7200	quilômetro
	Elaboração de orçamento	de infraestrutura rodoviária		117,7200	quilômetro
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

CONVÊNIO Nº 90866/2020 MAPA - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 2ª ETAPA

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local: CAMILA DOSS
05387196150
052.671.961-50 - CAMILA DOSS
ANDREA WAGNER
0338827115
03.347.135/0001-16 - MUNICÍPIO DE JACIARA - PREFEITURA MUNICIPAL

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confes.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br ou crea@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso

Nosso Número: 14000000004541184

Valor ART: R\$ 88,78

Registrada em 04/08/2021

Valor Pago: R\$ 88,78
